

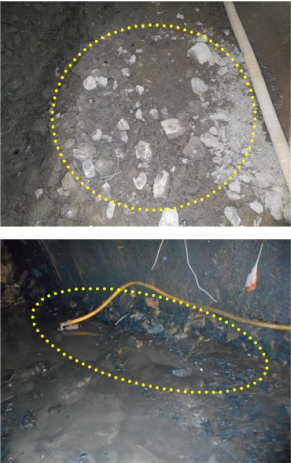

정기(기동점검) 점검 조치결과보고

[신림선 도시철도 민간투자사업 건설공사(3공구)]

□ 점검일시 : 2019.01.28 (월)

□ 조치결과

◆ 점검자 : 박수엽,전혜령

지적내용	점검사진	조치일자	조치사진
		조치내용	
<p>○ 전도재해 예방</p> <p>- 110E 환기구 지하 터널 보행로 구간에 버럭 등 거친 쇠석이 많아 통행 시 전도위험 있음. 노면 정돈요함. ※ 산업안전보건기준에 관한 규칙 제3조(전도의 방지) ※ 건설안전 기본지침 지하철-004 (터널 굴착작업)</p>		<p>2019.01.29</p> <p>-110E환기구내 보행자통로 쇠석 제거 및 다짐 실시하여 근로자 넘어짐 예방 조치 실시 완료</p>	
		<p>2019.01.29</p> <p>- 111정거장 상부 철제 저수조 외함접지 실시 완료</p>	
<p>○ 감전재해 예방</p> <p>- 110E 환기구 지하 터널 중간에 설치된 분전반에 잠금장치가 열려있는 곳이 있음. 작업이 없을시 잠금 조치 요함. ※ 건설안전 기본지침 공통-16(분전반)</p>		<p>2019.01.29</p> <p>- 110E환기구 터널내 분전함 잠금장치 시건조치 완료</p>	

<p>○ 감전재해 예방</p> <p>- 111 정거장 하부에 설치된 분전반은 뒷면에 잠금장치 열쇠가 매달려 있는 상태로, 비전공 근로자들이 분전함을 열고 사용할 수 있어 감전등의 안전사고 우려가 있으니 잠금장치 열쇠는 정해진 관리자가 보관할 수 있도록 조치 바람. ※ 건설안전 기본지침 공통-16(분전반)</p>		<p>2019.01.29</p> <p>- 111정거장 터널내 분전함 잠금장치 시건조치 완료</p>	
<p>○ 보건 관리</p> <p>- 111정거장 상부에 설치된 위험물 저장소는 보관물질에 대한 물질안전보건자료(MSDS)를 취급 근로자들이 쉽게 볼 수 있도록 게시하고 교육하기 바람. ※ 건설안전 기본지침 공통-24(위험물 보관소)</p>		<p>2019.01.29</p> <p>- 111정거장 상부 위험물 저장소 물질안전보건자료 게시 조치 완료</p>	
<p>○ 기타 안전관리</p> <p>- 110E 환기구 지하 비상장구 보관함에 보관물품 종류와 개수를 표시한 표지판을 부착하여 작업자가 비상시 쉽게 인지할 수 있도록 정보 제공 조치요함.</p>		<p>2019.01.29</p> <p>- 110E환기구 비상장구 보관함 내 보관된 비상물품 현황판 게시 완료</p>	

<p>○ 기타 안전관리</p> <p>- 110 정거장에 설치된 복공판 중복공판 사이의 이격이 많이 벌어진 부분이 있으니 확인 후 보완하기 바람</p>		<p>2019.01.29</p> <p>- 110정거장에 설치된 복공판과 가복공판 이격되어 벌어진 구간은 철판 용접 실시하여 벌어지지 않도록 조치 완료</p>	
<p>○ 품질관리</p> <p>- 110 정거장 포장 구간은 다짐을 철저히 하여 추후 차량 통행시 꺼짐 등으로 인해 불편이 생기지 않도록 관리바람</p>		<p>2019.01.29</p> <p>- 110정거장 포장작업 시 다짐 철저히 시공하였으며 향후 꺼짐 및 갈라짐 등 발생되지 않도록 유지관리 실시 예정</p>	
