


정기(기동점검) 점검 결과보고

[동부간선도로(창동~상계구간) 지하차도 건설공사(우선시공분)]

- 점검일시 : 2022.01.13 (목)
- 점검결과
- ◆ 점검자 : 박상종

○ 추락재해 예방(토목부)

- 상계교 구간 천공기 리더부에는 수직구멍로프를 설치하고 구멍로프에는 근로자 추락 시 지지될 수 있도록 추락방지대를 설치 바람.
 - 천공기 후사경은 사각지대가 최소화될 수 있도록 위치를 조정 바람.
- ※ 산업안전보건 기준에 관한 규칙 제42조(추락의 방지)

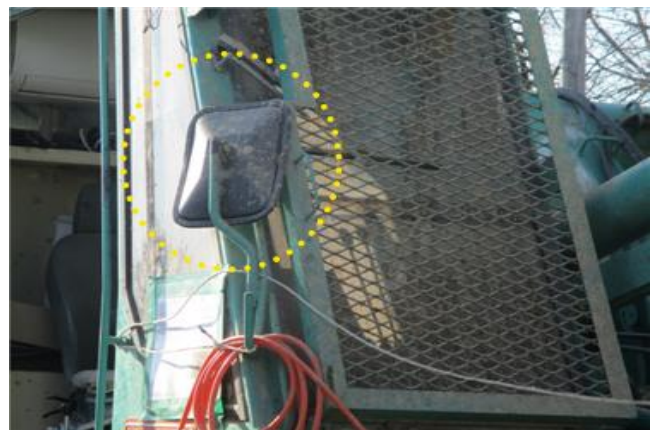

○ 건설기계 안전(토목부)

- 굴삭기는 작업 중 버킷 이탈에 의한 충돌, 낙하 등 안전사고가 발생하지 않도록 이탈방지핀을 체결하고 작업하도록 관련 운전자 안전교육 바라며, 후방 카메라는 후면 사각지대가 최소화될 수 있도록 조정 바람.

- 천공기, 굴삭기, 펌프카, 레미콘트럭 등 제한된 작업구간에서 동시에 작업할 경우 장비 간 충돌, 장비와 근로자 간 협착, 충돌 등 안전사고가 발생하지 않도록 신호수를 배치 바람.

※ 건설공사장 안전관리지침 p105 (협착, 충돌 재해예방), p137 (굴착기)

