

정기(기동점검) 점검 결과보고

[신림선 도시철도 민간투자사업 건설공사(1공구)]

□ 점검일시 : 2022.01.17 (월)

□ 점검결과

◆ 점검자 : 최영준

○ 가설통로 안전(도시철도사업부)

- 1) 104정거장 거푸집설치작업장 이동구간에 설치해 있는 가설통로구간은 상부 미고정, 자재 적치, 정리상태 미흡 등으로 작업자 이동간에 전도 등의 안전사고 발생우려가 있으니 보완을 실시하여 관리하기 바람.

- 2) 또한, 복공판 해체구간 주변 자재 적치 등으로 작업자 이동 통로가 협소하여 작업자 이동 등의 안전사고 발생우려가 있으니 조치하기 바람.


※ 산업안전보건기준에 관한 규칙 제22조(통로의 설치), 제23조(가설통로의 구조)



○ 추락재해 예방(도시철도사업부)

- 1) 102정거장 대합실에 설치되어 있는 외부비계 일부구간에 작업발판이 미설치되어 있고,
- 2) 내부에서 외부비계상으로 이동할 수 있는 통로가 미확보된 상태로 작업발판이 미고정되어 있어 작업자 추락 등의 안전사고 발생우려가 있으니 필요구간에 대하여 보완하기 바라며,
- 3) 해체작업을 실시할 경우 작업자가 상황을 인지할 수 있도록 전 구간에 대하여 확인을 실시하고, 위험공중 사전허가제에 반영하여 후속공중(해체작업)을 진행하기 바람.

※ 산업안전보건기준에 관한 규칙 제42조(추락의 방지), 제43조(개구부 등의 방호 조치)

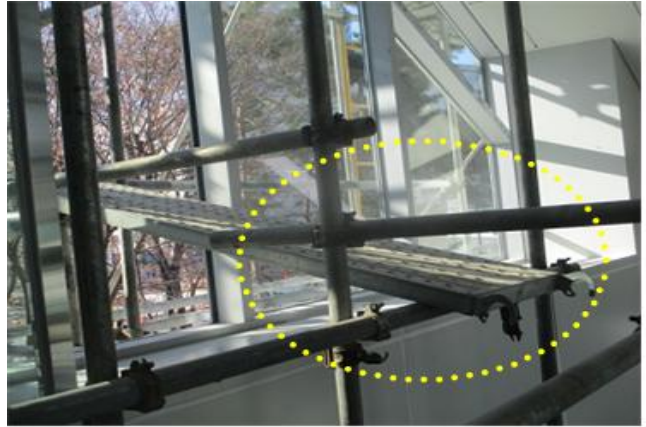

○ 건설기계 안전(도시철도사업부)

- 1) 104정거장 복공판 해체 인양작업구간 작업자가 굴착기 작업반경내에 통제없이 접근하는 상황이 목격되었으며,
- 2) 104정거장 작업중인 굴착기는 단차발생(복공판 해체)구간 작업중으로 이동시 전도(바퀴빠짐), 요동 등으로 인한 안전사고 발생우려가 있으니 보완하기 바람.



- 3) 또한, 101정거장 작업구간에서 굴착기 후면에서 통제없이 작업중인 작업자가 목격되었으니 재발되지 않도록 신호수를 배치하기 바라며, 해당작업자 및 건설기계 조종원, 신호수를 대상으로 사고사례중심의 안전교육을 실시하기 바람

※ 산업안전보건기준에 관한 규칙 제38조(사전조사 및 작업계획서의 작성 등), 제200조(접촉방지)

