

수경시설 관리대장

시 설 명		삼각산분수대						
위 치		강북구 송중동 860-2번지			관리번호	강북 -1		
수질정화장치		없음		관리부서		푸른도시과 조경시설팀 (정영미 901-6942)		
수경시설 종류		일반분수			급수원	상수도		
공 사 기 간		1993. 7. 8			총공사비	백만원(시, 구비)		
분수면적	654㎡	모타규격	7.5HPx2대 2HPx6대 1/3HPx7대	시공회사	-		조명여부	설치
분출높이	4m			물탱크 저수용량	60ton			
가 동 기 간		5. 1 ~ 9. 30		하루 가동시간	12:00~ 12:30 13:00~ 13:30 14:00~ 14:30 16:00~ 16:30 17:00~ 17:30 18:00~ 18:30 총 6회 3시간			
특 징(기타)		조형분수						
현 황 사 진								


수경시설 관리대장

시 설 명		수유일공원						
위 치		강북구 수유동 605-389번지 일대			관리번호	강북 -2		
수질정화장치		없음		관리부서		푸른도시과 조경시설팀 (서윤석 901-6938)		
수경시설 종류		바닥분수			급수원	상수도		
공 사 기 간		2006. 12. 27. ~ 2007.12.27.		총공사비	300백만원(시비)			
분수면적	50m ²	모타규격	1HP x2대	시공회사	서경건설개발(주)		조명여부	설치
분출높이	4m			물탱크 저수용량	20ton			
가 동 기 간		5.1 ~ 9.30		하루가동시간	12:00~12:30, 13:00~14:00 17:00~17:30 총3회 2시간			
특 징(기타)								
현 황 사 진								

수경시설 관리대장

시 설 명		별말어린이공원						
위 치		강북구 번2동 235			관리번호	강북 -3		
수질정화장치		순환정수		관리부서	푸른도시과 공원팀 (이덕신 901-6925)			
수경시설 종류		바닥분수			급수원	상수도		
공 사 기 간		2008. 12. 22. ~ 2009. 04. 21.		총공사비	1,540백만원(시100%)			
분수면적	37m ²	모타규격	1HPx 9대	시공회사	용일토건(주)		조명여부	설치
분출높이	1.2m			물탱크 저수용량	없음			
가 동 기 간		5.1 ~ 9.30		하루가동시간	12:00~12:30, 13:00~14:00 17:00~17:30 총3회 2시간			
특 징(기타)		어린이공원 내 소규모시설						
현 황 사 진								

수경시설 관리대장

시 설 명		색동어린이공원					
위 치		강북구 수유1동 49-7번지			관리번호	강북-4	
수질정화장치		순환정수		관리부서		푸른도시과 공원팀 (이덕신 901-6925)	
수경시설 종류		바닥분수			급수원	상수도	
공 사 기 간		2009. 02. 20. ~ 2009. 06. 15.		총공사비	748백만원(시524,구비224)		
분수면적	38㎡	모타규격	1HP x 8대	시공회사	(주)경안종합조경	조명여부	설치
분출높이	1.2m			물탱크 저수용량	없음		
가 동 기 간		5.1 ~ 9.30		하루 가동시간	12:00~12:30, 13:00~14:00 17:00~17:30 총3회 2시간		
특 징(기타)		어린이공원 내 소규모시설					
현 황 사 진							

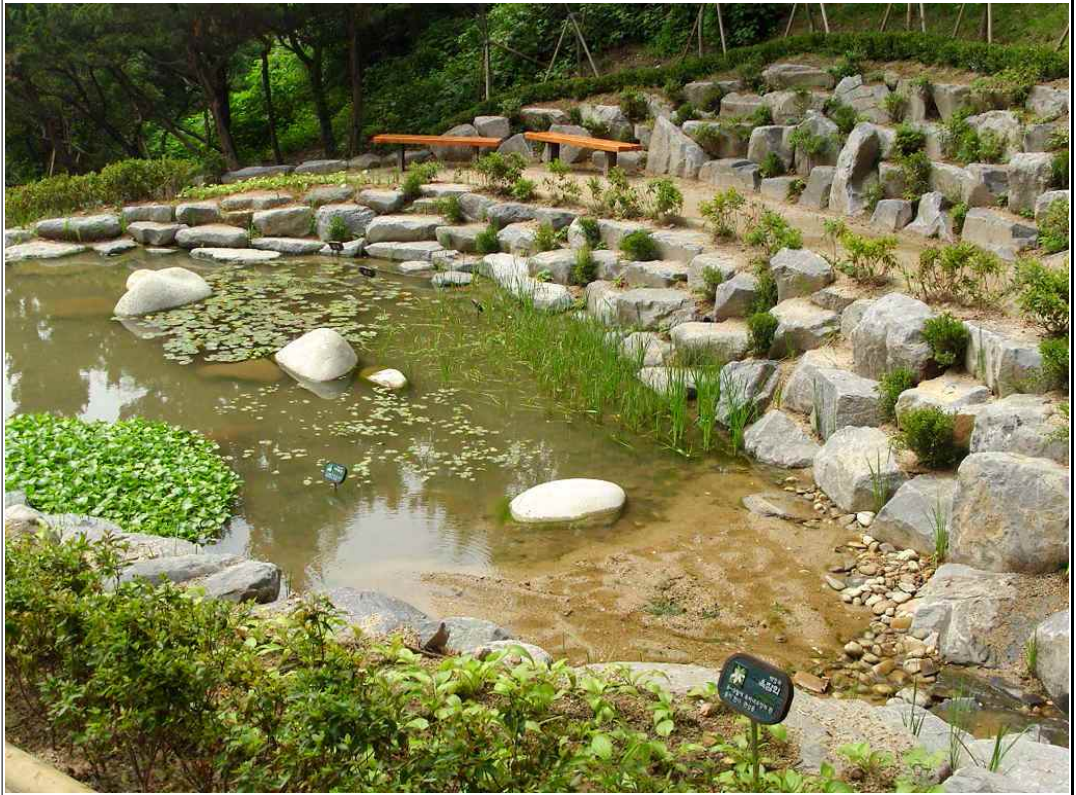
수경시설 관리대장

시 설 명		솔밭근린공원						
위 치		강북구 우이동 80			관리번호	강북-5		
수질정화장치		없음		관리부서		공원녹지과 공원팀 (한소진 901-6924)		
수경시설 종류		일반, 계류, 벽천			급수원	상수도		
공 사 기 간		2009. 03. 26. ~ 2009. 06. 22.		총공사비	750백만원(구100%)			
분수면적	118㎡	모타규격	2~4HPx4대	시공회사	(주)그룹이십일		조명여부	미설치
분출높이	1.5m			물탱크 저수용량	없음			
가 동 기 간		5.1 ~ 9.30		하루가동시간	계 속			
특 징(기타)		근린공원 내 소규모시설						
현 황 사 진								

수경시설 관리대장

시 설 명		오얏골어린이공원					
위 치		강북구 번2동 228		관리번호	강북 - 6		
수질정화장치		없음		관리부서	푸른도시과 공원팀 (이덕신 901-6925)		
수경시설 종류		우산분수, 계류		급수원	상수도		
공 사 기 간		2009. 04. 13. ~ 2009. 06. 23.		총공사비	563백만원(구100%)		
분수면적	65㎡	모타규격	7.5HPx1대	시공회사	(주)세이브건설	조명여부	미설치
낙하높이	1.8m			물탱크 저수용량	없음		
가 동 기 간		5.1 ~ 9.30		하루가동시간	12:00~12:30, 13:00~13:30 13:00~14:00, 17:00~17:30 총4회 2시간		
특 징(기타)		어린이공원 내 소규모시설					
현 황 사 진							

수경시설 관리대장

시 설 명		북한산 도시자연공원						
위 치		강북구 삼각산동 산108-19번지			관리번호	강북 -7		
수질정화장치		없음		관리부서		푸른도시과 공원팀 (박성희 901-6927)		
수경시설 종류		생태계류, 생태연못2			급수원	유출지하수		
공 사 기 간		2009. 3.31 ~ 6.17		총공사비	585 백만원(시비)			
분수면적	256.6m ²	모타규격	없음	시공회사	(주)슈퍼종합개발		조명여부	없음
분출높이	m			물탱크 저수용량	없음			
가 동 기 간		연중		하루 가동시간	연중			
특 징(기타)		자연발생적 계류 이용한 친수시설						
현 황 사 진								


수경시설 관리대장

시 설 명		오동근린공원						
위 치		강북구 번2동 산23-23번지일대			관리번호	강북-8		
수질정화장치		bio filter		관리부서		푸른도시과 공원팀 (김응주 901-6923)		
수경시설 종류		계류			급수원	유출지하수		
공 사 기 간		2009. 03. 27 ~ 2009. 06. 20		총공사비	947백만원(구100%)			
분수면적	625㎡	모타규격	30HPx1대	시공회사	(주)지산원		조명여부	미설치
분출높이	m			물탱크 저수용량	없음			
가 동 기 간		5.1 ~ 9.30		하루가동시간	연중			
특 징(기타)		근린공원 내 소규모시설						
현 황 사 진								

수경시설 관리대장

시 설 명		오동공원내 생태연못 및 생태계류						
위 치		강북구 번2동 산27-3			관리번호	강북-9		
수질정화장치		있음		관리부서		푸른도시과 공원팀 김응주(901-6923)		
수경시설 종류		생태연못 및 생태계류			급수원	유출지하수		
공 사 기 간		2010. 03.15 ~ 2010. 06. 07		총공사비	302,701천원(시비100%)			
분수면적	1,136.4m ²	모타규격	2HP×2대	시공회사	씨아이조경(주)		조명여부	미설치
분출높이	-			물탱크 저수용량	없음			
가 동 기 간		5.1 ~ 9.30		하루 가동시간	연중			
특 징(기타)		계류 주변에 잣나무숲 조성						
현 황 사 진								

수경시설 관리대장

시 설 명		오동근린공원 친수공간 순환계류						
위 치		강북구 미아동 산1-2			관리번호	강북-10		
수질정화장치		없음		관리부서	푸른도시과 자연생태팀 (김유라 901-6935)			
수경시설 종류		계류, 연못			급수원	상수도		
공 사 기 간		2010. 10. 1 ~ 10. 30		총공사비	213,460천원			
분수면적	50m ²	모타규격	7.3HP	시공회사	미르워터월드		조명여부	없음
분출높이				물탱크 저수용량				
가 동 기 간		5.1 ~ 9.30		하루 가동시간	연중			
특 징(기타)								
현 황 사 진								

수경시설 관리대장

시 설 명		미아8구역						
위 치		강북구 삼각산동 811-10번지 일대			관리번호	강북-11		
수질정화장치		없음.		관리부서		푸른도시과 조경시설팀 (정영미 901-6942)		
수경시설 종류		바닥분수			급수원	상수도		
공 사 기 간		2010.3.01 ~ 2010.4.10		총공사비				
분수면적	9.3m ²	모타규격	2마력 1마력	시공회사	(주)대화조경		조명여부	없음
분출높이	최대 5m			물탱크 저수용량	6TON			
가 동 기 간		5.1 ~ 9.30		하루 가동시간	12:00~12:30, 13:00~13:30 17:00~17:03 총3회 1시간 30분			
특 징(기타)		분수 분출 노즐 16개 설치.						
현 황 사 진								

수경시설 관리대장

시 설 명		구천폭포					
위 치		강북구 삼각산동 813-6			관리번호	강북-12	
수질정화장치		BIO-SYSTEM		관리부서	푸른도시과 공원팀 (이덕신 901-6925)		
수경시설 종류		벽천, 연못			급수원	상수도	
공 사 기 간		2010년		총공사비			
분수면적	230㎡	모타규격	100A*3KW-2대	시공회사	용정	조명여부	있음
분출높이	12m		125A*5.5KW-1대	물탱크저수용량	하부수조량 57TON		
가 동 기 간		5.1 ~ 9.30		하루 가동시간	12:00~12:30, 13:00~13:30 18:00~18:30, 총3회 1시간 30분		
특 징(기타)							
현 황 사 진							

수경시설 관리대장

시 설 명		희망어린이공원						
위 치		강북구 수유3동 193-1			관리번호	강북 -13		
수질정화장치		없음		관리부서		푸른도시과 공원팀 (이덕신 901-6925)		
수경시설 종류		계류			급수원	상수도		
공 사 기 간		2011.12.19 ~ 2012.4.30		총공사비	백만원(시, 구비)			
분수면적	62㎡	모타규격	2HP(1.5KW) x 2대	시공회사	한림에코(주)		조명여부	설치 (12EA)
분출높이	4m			물탱크 저수용량	2ton			
가 동 기 간		5.1 ~ 9.30		하루 가동시간	12:00~12:30, 13:00~14:00 17:00~17:30 총3회 2시간			
특 징(기타)								
현 황 사 진								

수경시설 관리대장

시 설 명		우이동 만남의 광장						
위 치		강북구 우이동 186-5			관리번호	강북 -14		
수질정화장치		없음		관리부서		푸른도시과 자연생태팀 (강원석 901-6933)		
수경시설 종류		이동식 분수			급수원	상수도		
공 사 기 간		2014.11.17 ~ 2015.2.20		총공사비		백만원(시, 구비)		
분수면적	5m ²	모타규격	990W 1대	시공회사	아트 스프링		조명여부	설치 (3EA)
분출높이	1.3m		680W 1대 580W 1대		물탱크 저수용량	0.5ton		
가 동 기 간		5.1 ~ 9.30		하루 가동시간		09:00~10:30, 12:00~13:00 16:00~17:00 총3회 3시간		
특 징(기타)								
현 황 사 진								
