10단계	3공구 110정거장 교통처리계획도[12] - 당초

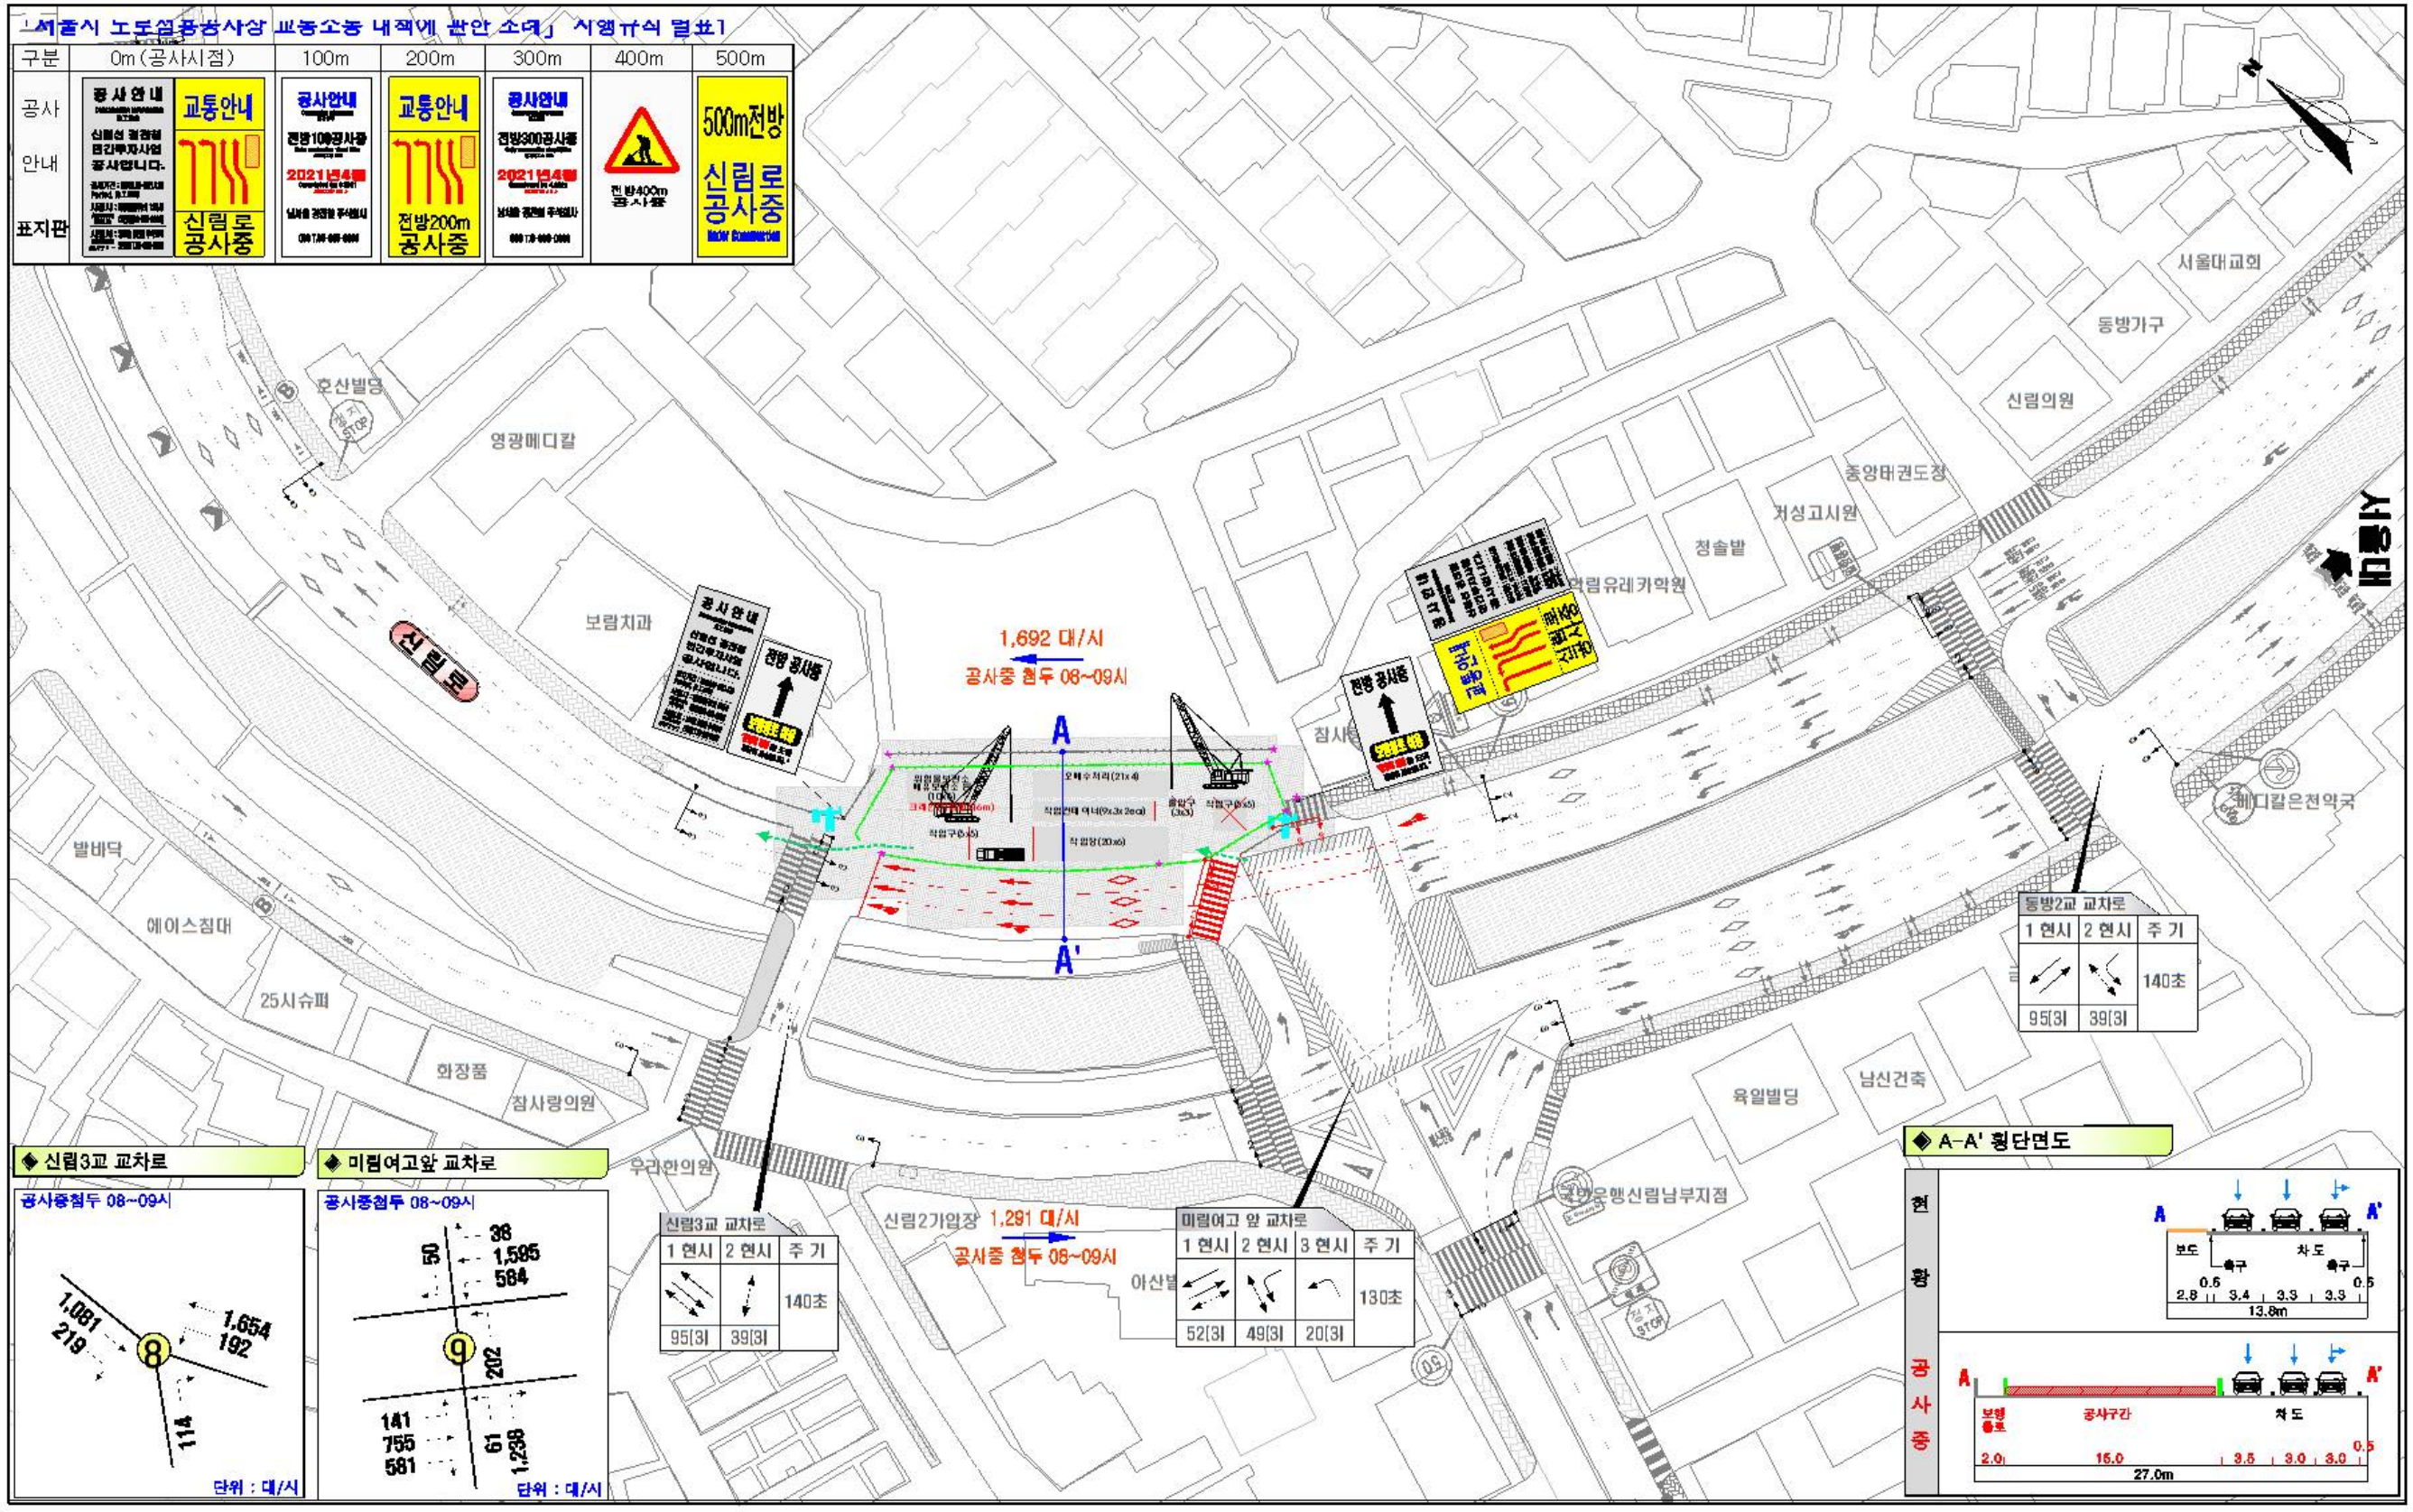

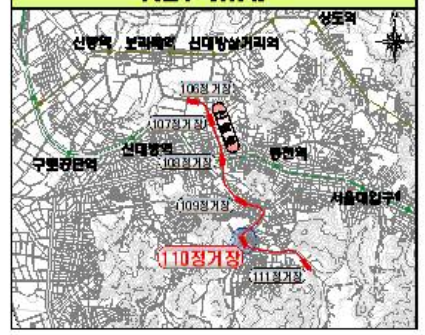

공 사 개 요

1. 공사시행도로 : 신림로
2. 점용시간 및 공사시간 : 전일(24시간)
3. 공사방법 :
   - ○ 작업구 설치
   - 안전시설물 설치 → 작업구 설치→정거장 내부구조물 설치→출입구, 환기구, E/V 설치 등
4. 점용차로수 : 기존 차로수 유지

공 사 기 간

작업구 설치 기간
- 2016. 8.17 ~ 8.25 (9일)

정거장 및 본선 설치 기간
- 2016. 8.26 ~ 2021. 3.23 (약 56개월)

공사중 교통관리 방안

1. 교통통제수 배치
2. 『서울특별시 도로점용공사장 교통소통 대책에 관한 조례 시행규칙』에 의해 공사안내 표지 설치
3. 공사관련차량 추가 차로점용이 발생하지 않도록 현장관리
4. 휀스 + 윙카 설치

범 례

	안전휀스 및 윙카
	라바콘
	투명휀스
	교통통제수
	공사구간
	공사차량
	차량동선
	점멸표지판
	임시차선도색

공 사 명	공 사 시 행 자	교 통 소 통 대 책 작 성	책임자	고진영	설계일자	도 면 명	축 척
신림선 경전철 민간투자사업 (변경) 3공구 110정거장	남서울경전철주식회사	(주)지평도시교통 엔지니어링	검토자	하재환	2019. 07.	3공구 110정거장 교통처리계획도(12) - 10단계	scale 0 20 50 100m
			작성자	김희정			
