□ 남산예장자락 재생사업 주변 교통처리계획도

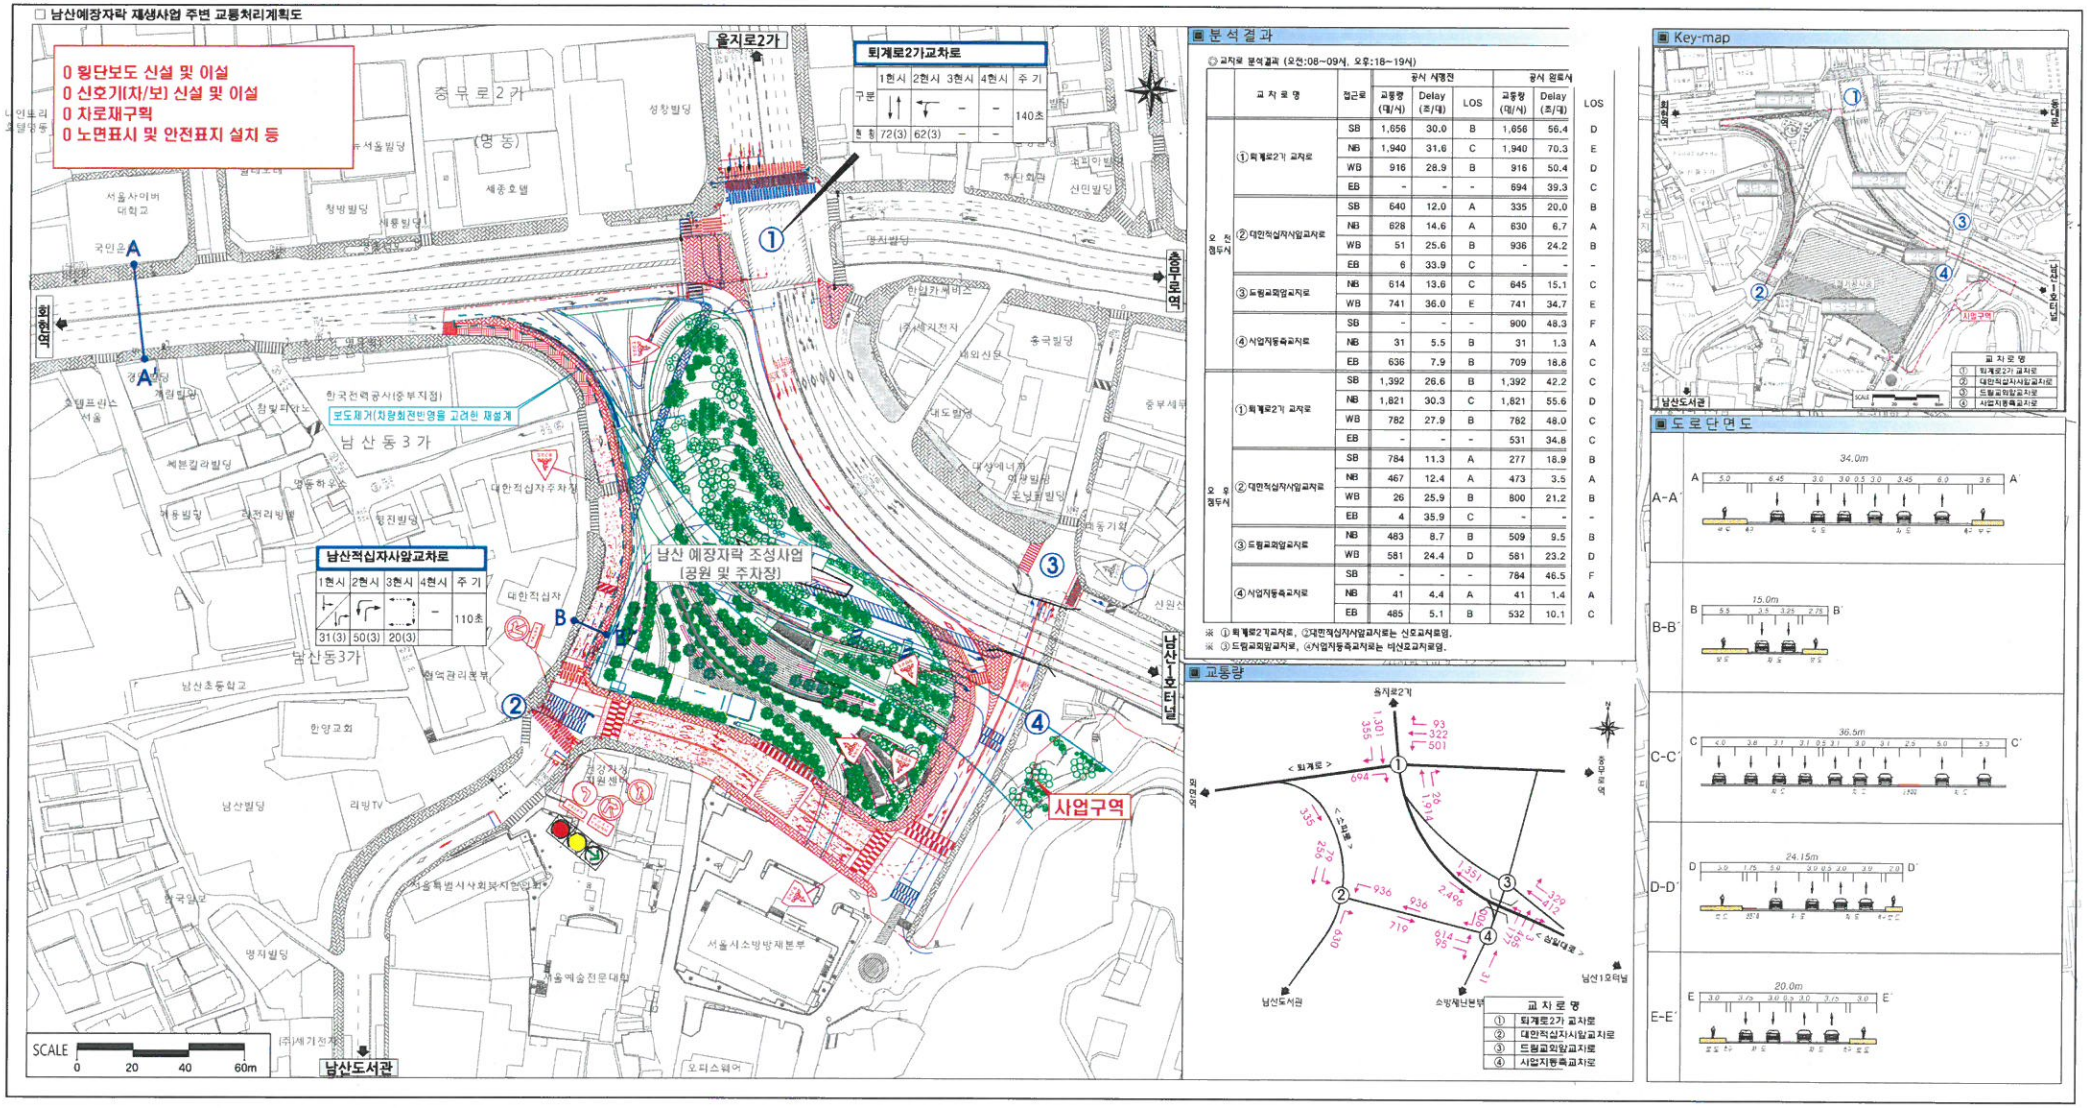

분석결과

◎ 교차로 분석결과 (오전:08~09시, 오후:18~19시)

	교 차 로 명	접근로	공사 시행전 교통량 (대/시)	공사 시행전 Delay (초/대)	공사 시행전 LOS	공사 완료시 교통량 (대/시)	공사 완료시 Delay (초/대)	공사 완료시 LOS
오전	①퇴계로2가 교차로	SB	1,656	30.0	B	1,656	56.4	D
		NB	1,940	31.6	C	1,940	70.3	E
		WB	916	28.9	B	916	50.4	D
		EB	-	-	-	694	39.3	C
	②대한적십자사앞교차로	SB	640	12.0	A	335	20.0	B
		NB	628	14.6	A	630	6.7	A
		WB	51	25.6	B	936	24.2	B
		EB	6	33.9	C	-	-	-
	③드럼교회앞교차로	NB	614	13.6	C	645	15.1	C
		WB	741	36.0	E	741	34.7	E
	④사업지동측교차로	SB	-	-	-	900	48.3	F
		NB	31	5.5	B	31	1.3	A
		EB	636	7.9	B	709	18.6	C
오후	①퇴계로2가 교차로	SB	1,392	26.6	B	1,392	42.2	C
		NB	1,821	30.3	C	1,821	55.6	D
		WB	782	27.9	B	782	48.0	C
		EB	-	-	-	531	34.8	C
	②대한적십자사앞교차로	SB	784	11.3	A	277	18.9	B
		NB	467	12.4	A	473	3.5	A
		WB	26	25.9	B	800	21.2	B
		EB	4	35.9	C	-	-	-
	③드럼교회앞교차로	NB	483	8.7	B	509	9.5	B
		WB	581	24.4	D	581	23.2	D
	④사업지동측교차로	SB	-	-	-	784	46.5	F
		NB	41	4.4	A	41	1.4	A
		EB	485	5.1	B	532	10.1	C

※ ①퇴계로2가교차로, ②대한적십자사앞교차로는 신호교차로임.
※ ③드럼교회앞교차로, ④사업지동측교차로는 미신호교차로임.

교통량

Key-map

도로단면도
