정기(기동점검) 점검 결과보고

〔서울 공예박물관 조성 기계공사(장기1차)〕

□ 점검일시 : 2020.03.03 (화)

□ 점검결과

◆ 점검자 : 정달영

○ 기계기구 안전(설비부) - 본관 2층 고속절단기는 사용중인 것으로 보이나, 보조덮개 제거, 바이스 미설치 등으로 위험하여 교체 지시하였으나 - 이동후 재사용중이므로 고속절단기에 의한 재해가 발생하지 않도록 부착되어야 할 안전장치를 부착하고 작업하도록 교육 및 관리 요함. ※ 건설안전기본지침 공통-26(고속절단기)	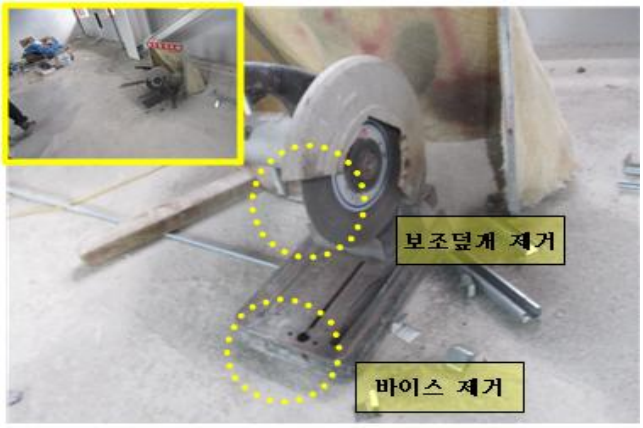
○ 기계기구 안전(설비부) - 고속절단기, 용접기, 드릴, 핸드 그라인더 등 현장에서 사용하고 있는 기계기구는 반입전 및 정기적(매월)으로 검사를 실시하고 그 결과를 부착하고 사용하여야 하나, 대부분 점검하지 않고 사용중이니 조치 요함. ※ 건설안전기본지침 공통-28(위험기계기구 안전검사)	

○ 감전재해 예방(설비부) - 현장내(본관 및 직물관) 가설전선의 접지선 단락, 콘센트의 미접지 상태 등이 많이 발견되니, 가설전선을 점검하여 접지가 된 상태로 사용하기 바람. ※ 건설안전기본지침 공통-17(가설전선)	 접지선 단락
	 전선 미접지
○ 추락재해 예방(설비부) - 현장내 이동식틀비계는 발끝막이판 및 안전난간이 미설치된 상태가 많으니 조치 요함. ※ 건설안전기본지침 공통-7(이동식 비계)	

○ 추락재해 예방(설비부) - 현장내 A형 사다리가 아웃트리거가 없거나 손상된 상태이므로 반출하고 -아웃트리거를 인출하지 않은 상태로 세워져 있는 것들이 많아 아웃트리거를 인출하지 않고 작업하였다고 추측되니 이동 및 작업시 아웃트리거를 인출 및 고정하여 작업하도록 교육관리 요함. ※ 건설안전기본지침 공통-5(사다리(A형))	
