정기(기동점검) 점검 결과보고

〔광복교~안양교 도로확장공사〕

□ 점검일시 : 2021.11.25 (목)

□ 점검결과

◆ 점검자 : 최영준

○ 건설기계 안전(토목부) - 광명테크노타운 옆 광장부 경계석 설치작업구간에서는 신호수 없이 굴착기와 작업자가 근접하여 작업중에 있어 작업간에 건설기계와의 충돌로 인한 안전사고 발생우려가 있으니 신호수 배치, 접근금지봉 설치, 후방 모니터링 등을 실시하고, 조종원과 작업자를 대상으로 하는 안전교육을 실시하기 바람. ※ 산업안전보건기준에 관한 규칙 제200조(접촉 방지)	
○ 기계기구 안전(토목부) - 구일로 보도블럭 설치작업장(경사구간) 작업자가 고정되지 않은 이동식 고속절단기를 한쪽발로 고정을 실시하며 작업중으로 불안정한 행동으로 인한 협착, 회전축 노출로 인한 끼임 등의 안전사고 발생우려가 있으니 즉시 보완조치 후 작업을 진행하기 바람. ※ 산업안전보건기준에 관한 규칙 제87조(원동기/회전축 등의 위험 방지)	

○ 품질관리(토목부) - 구일로에 설치되어 있는 계단 난간의 볼트체결 상태가 일부 미흡한 구간이 확인되니 전 구간 확인를 실시하고 필요구간에 대하여 조치하기 바람.	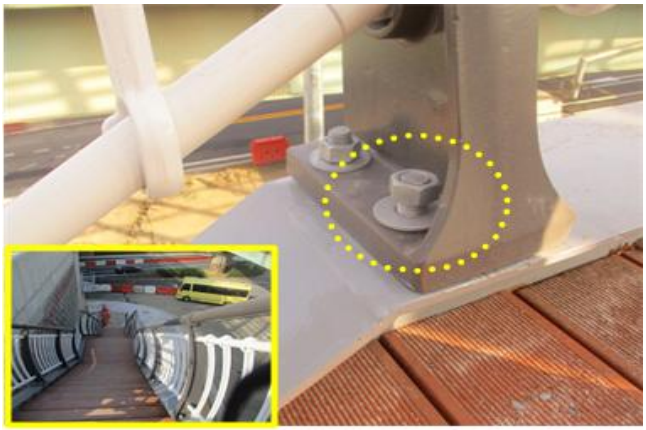
○ 기타 안전관리(토목부) - 서부샛길 작업장 진입구간에는 주변 통행차량이 사전에 작업구간임을 인지하도록 교통안내 표지판을 설치하여 관리하기 바라며, - 도로구간 인접 작업자를 대상으로 건설공사장 교통사고 사례를 중심으로 특별 안전교육을 실시하기 바람.	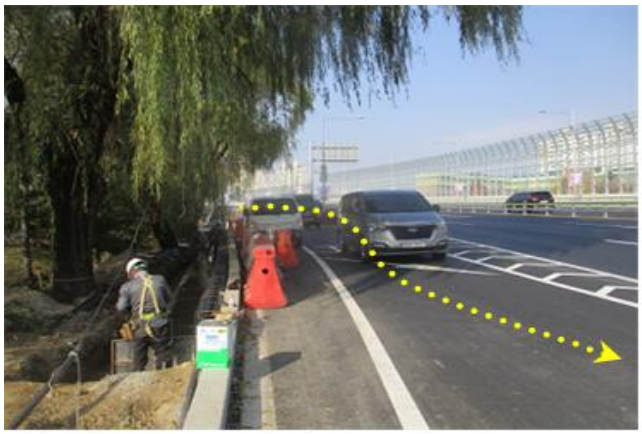 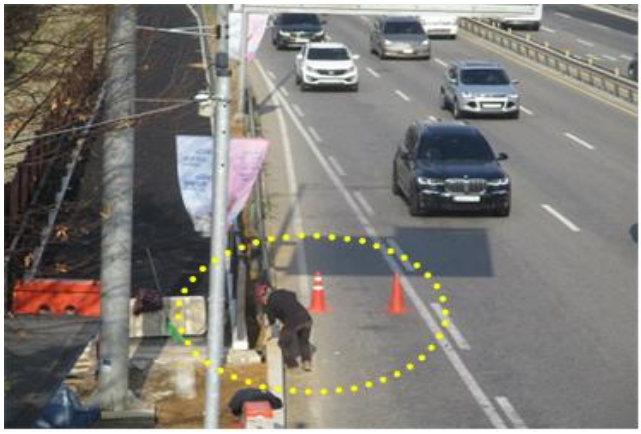
○ 기타 안전관리(토목부) - 안양교 A1 하부 보행통로는 일반시민이 이용중에 있으나 보도상 건설자재가 방치되어 있어 보행중에 전도 등의 안전사고 발생우려가 있으니 정리정돈을 실시하기 바라며, - 전체적으로 산발적인 작업이 진행중으로 작업장 출입통제 및 화재발생시 조치자 늦어질 수 있으니 통제구간 재정비, 모든 작업장에 적정 소화	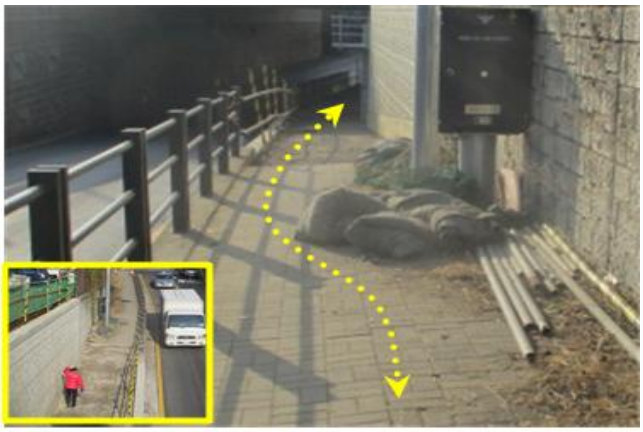

기 비치 등을 확인하여 관리하기 바람.	
