

		시 민		
문서번호	시설과-1979	시설팀장	시설과장	시설관리부장
결재일자	2020.5.22.	최이영	송병욱	신용철
공개여부	부분공개(4)	상수도사업본부본부장		
방침번호		05/22 구아미		
		협 조		
		법무팀장		
		고석진		

I·SEOUL·U
 너와 나의 서울

법률자문 계획 보고



2020. 5.

상수도사업본부
 (시설관리부)

사전 검토항목

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘■’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)

구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토 완료	해당 없음	비 고
시 민 참 여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
전 문 가 자 문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
사 회 적 약 배 자 려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
일 자 리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
선 거 법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
안 전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
타 기 관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
정 책 영 문 화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목·요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
바 른 우 리 말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
결 재 문 서 공 개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

2010~15년 시행 「고도정수처리시설공사」의 *공사기간 연장 간접비 관련 법률자문 계획 보고

I 법률자문 배경

*

〈 간접비 조정 근거 〉


「지방자치단체를 기준으로 하는 계약에 관한 법률」 제 75조 및 「동법 시행규칙」 제74조,
「지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준」, 「공사계약일반조건」

< 합의 상세 내용 >

II 법원판결 및 재상고 현황

〈 대법원 판결 내용 (18.10.30) 〉

- **주요쟁점** : 장기공사에서 총공사기간이 최초 연차계약에 부기한 공사기간보다 연장된 경우 계약금액 조정을 인정할 수 있는지 여부
- **판결결과** : 장기계속공사에서 '차수별 계약의 독립성' 인정
 - 총괄금액 및 총공사기간은 연차별계약을 위한 잠정적 기준일 뿐, 연차별 계약에서 하자보증금 납부 및 지연배상금의 납부 등을 기준하는 점에서 원심은 법리를 오해함.

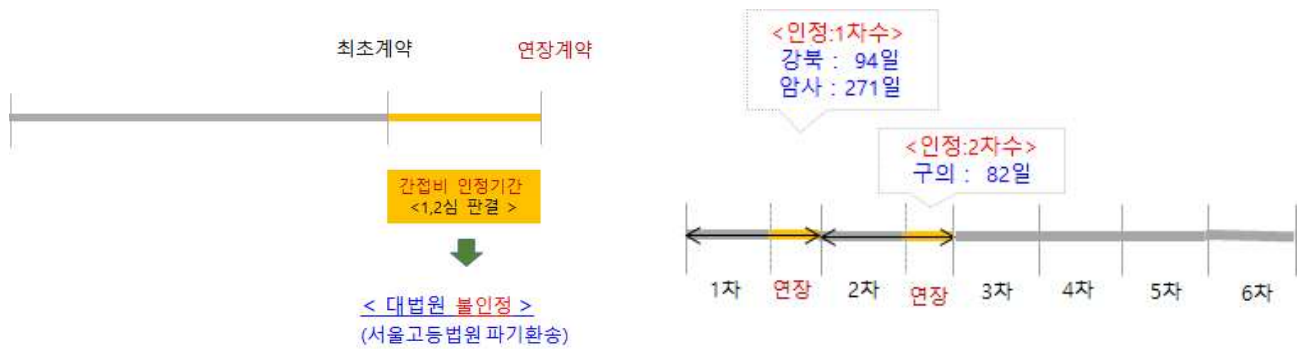

III 간접비 정산(환수)금액

공시명	〈당초〉 간접비 지출 금액(총괄계약)				〈변경〉 재산정 정산 금액(차수계약)						환수금액 (A-B)	
	당초계약	연기기간	준 연 공 기	간접비(A)	차수	기간	연기기간	연 사 유	준 연 공 기	간접비(B)		
				3,784							846	-2,938
강북	'10.02.18. ~'12.12.18	'12.12.19 ~'14.10.31	682일 (22.7월)	784	1차	'10.02.18. ~'10.12.18	'10.02.18. ~'11.03.22	사업비 조정	94일 (3.1월)	108	-676	
암사	'10.02.18. ~'12.12.18	'12.12.19 ~'14.10.31	577일 (18.9월)	1,100	1차	'09.10.06. ~'10.04.03	'09.10.06. ~'10.12.30	문화재 발굴	271일 (9.0월)	517	-583	
구의	'09.11.23. ~'13.01.15	'13.01.16 ~'14.12.20	704일 (23.2월)	1,900	2차	'10.05.28. ~'11.02.07	'10.05.28. ~'11.04.30	대체급수 조정	82일 (2.7월)	221	-1,679	

〈 간접비 관련 시공사 회의 〉

- 일 시 : 2020. 5. 15(금) 16:00 ~ 18:00
- 장 소 : 본부 5층 회의실(북카페)
- 참 석 자 : 7명 (내부 2명 외부 5명)
 - 본 부 : 최이영(시설과), 고석진 변호사
 - 시공사 : 대우건설 박영진 대리, 우정우 변호사 / 대보건설 정성인 과장
고려개발 이흥기 부장, 허수강 차장

IV 법률 자문요지

〈 자문사항 : 1항 〉

정산금 원금에 대한 이자 또는 지연손해금 지급 기산점.

< 자문사항 : 2항 >

합의금 원금에 대한 이자 등에 적용되는 이율이 얼마인지.

(위 자문사항 1항에서 을설을 취할 경우에는 당장은 이율이 문제가 되지 않는
것이나 그 경우에도 향후 재상고심 선고시 부터의 이율은 문제가 될 것임)

IV 향후 계획
