

★ ◎



문서번호	안전치수과-9353
결재일자	2015.6.3.
공개여부	대시민공개
방침번호	

지방시설주사	치수팀장	안전치수과장		
협 조				

2015년 성수동 구의로하수관로 유로변경공사

공 사 실 정 보 고



공사실정보고

본 공사는 공사구간 전체가 상가 및 공장지역으로 화물운송 차량 출입이 빈번하여 통제시 영업피해에 대한 다수의 민원발생이 예상되고, 공사 진행에 어려움이 있어 민원발생 잔여구간 야간공사 시행으로 민원방지 및 우기전 공사완료코자 합니다.

I 관련근거

- 태정-05호(2015. 5. 26) 실정보고서 제출(5차)

II 사업개요

- 공 사 명 : 2015년 성수동 구의로하수관로유로변경공사
- 공사규모 : □2.5×2.5m~2.0×2.0m, L=473m
- 공사기간 : 2015. 4. 2 ~ 2015. 12. 27.
- 계 약 자 : 태정개발(주)
- 현 공 정 : 45.2% (5.26 현재)
- 사업비현황


(단위:천원)

총사업비	도 급 비	관 급 비	이전비 및 기타
2,446,048	1,487,748	614,300	344,000

III 실정보고내용

- 본 공사구간은 전체가 상가 등 공장 지역으로 화물차량, 상·하역차량등 자동차 운행이 주간에는 상당히 많은 구간으로 차량통제시 영업피해에 따른 상당한 민원이 예상되고 있으며, 계획공기(2015.6.30) 이내에 완료가 어려운 실정으로 부득이 야간공사를 시행하여 민원발생 방지와 우기 이전 공사를 완료하여 수해예방에 철저를 기하고자 합니다.

[위 치 도]

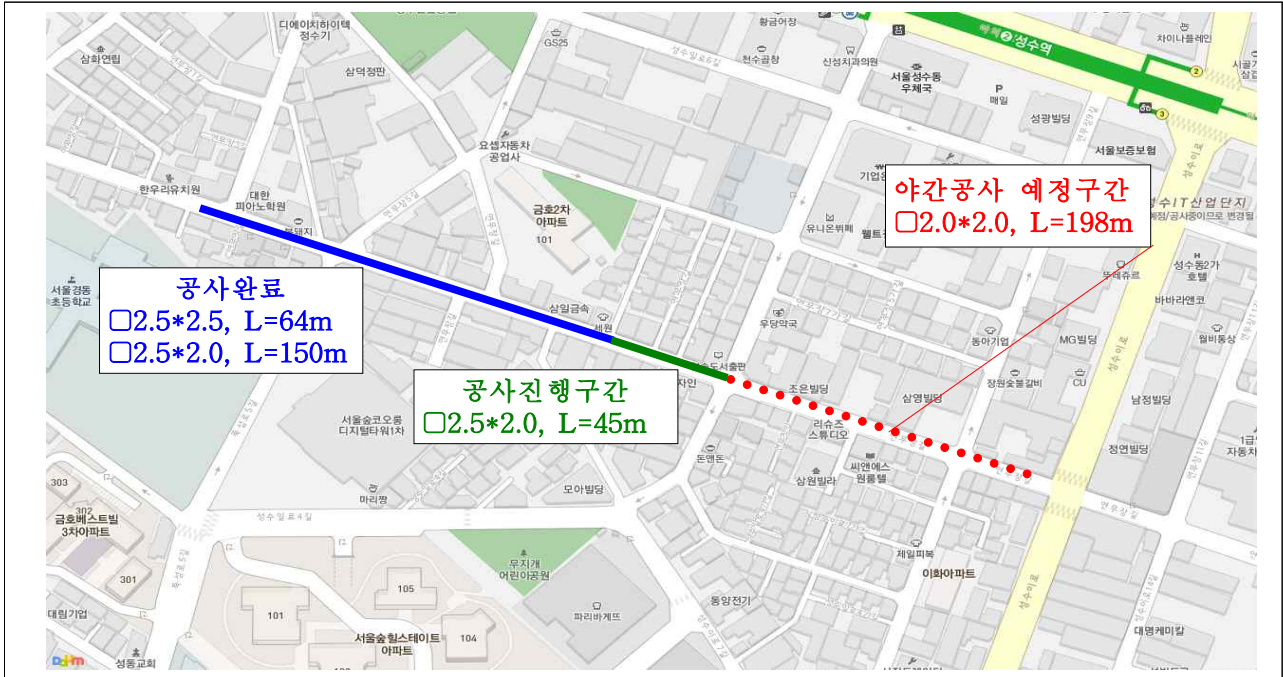

○ 공사비 검토

- 야간공사(증액) : 114,950천원
- 이설비 : 253,153천원

○ 주,야간 공정비교표

공기 구분	PC박스 부설수량 (일)	5.25	6.1	6.8	6.15	6.22	6.29	7.6	7.13	7.20	
주간공사	2~3분	—————									
야간공사	5~6분	—————									

IV 검토의견

- 야간공사로 인한 도급액 증액(114,950천원)부분은 본공사의 이설비 (253,153천원)로 충분하며, 야간공사시 PC박스 부설량은 하루5~6분 으로 우기이전 완료 가능하여 주간공사로 인한 영업피해등에 따른 민원사항해 결을 위하여 야간공사 승인코자 합니다.

- 따로붙임 1. 실정보고 공문 1부.
2. 실정보고 내역서 1부. 끝.
