



문서번호	토목과-3739
결재일자	2015.4.3.
공개여부	대시민공개
방침번호	부구청장 방침 제154호

주무관	토목팀장	토목과장	안전건설교통국장	부구청장				
협조 재무과장 계약팀장 도로조명팀장								

마장동 399-96 외 2개소 도로공사 발주계획



성 동 구

마장동 399-96외 2개소 도로공사 발주계획

2014 특별교부금 대상사업인 「마장동 399-96번지 도로개설공사」 발주 시 소규모 도로 구조개선공사인 성수동 가각정비 및 옥수동 진입로 확장공사를 통합 발주하여 사업관리에 만전을 기하고자함.

□ 추진근거

- 구청장 방침 제243호('14.05.14. 마장동399-96주변 도로개설사업 시행계획)
- 지방자치단체 세출예산집행기준(안전행정부 예규, 2015.1.1시행)

유사·중복사업의 통합발주 노력

- 자치단체장은 사업내용이 유사하거나 중복되는 사업은 법령의 범위내에서 통합발주를 위하여 적극 노력하여 지출성과를 극대화할 수 있도록 해야 함
- 「지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준」에 의한 『동일구조물공사』 및 『단일공사』는 기본적으로 통합발주를 해야 하며 예산 집행과정에서 단일사업으로 예상되는 경우에도 통합발주 해야 함


□ 사업현황

(단위: 천원)


사업명	사업규모	예산액	비고
3건		700,000	
마장동 399-96주변 도로개설공사	. 도로개설 B=6m, L=70m	600,000	토지보상비 등 포함
성수동1가 롯데 서울숲 II 캐슬 진입로 가각정비공사	. 도로 가각정비 B=4m→6m, L=15m . 가로등 분전함 이설 5개소 . CCTV통합주 이설 1개소 . 한전주 및 통신주 이설 4개소	50,000	
옥수교회앞 독서당로 진입도로 확장공사	. 도로 편경사 정비 L=30m . 충격흡수시설 설치 1개소	50,000	

○ 위치도 및 현황사진

마장동 399-96주변 도로개설공사

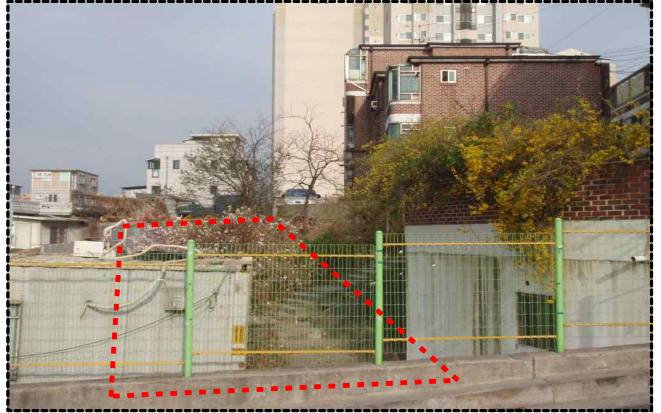

성수동1가 롯데 서울숲 IT캐슬 진입로 가각정비공사

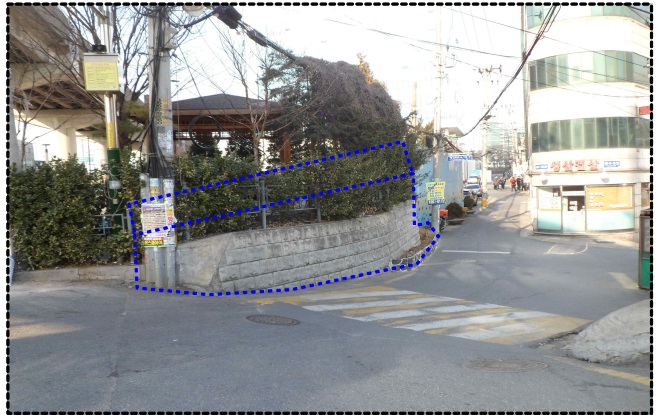

옥수교회앞 독서당로 진입도로 확장공사



□ 통합발주계획

○ 통합발주 사유

- 옥수동과 성수동 공사는 예산유보율(15%)과 이설비(분전함 5개소, CCTV 1개소 등)를 제외하면 실 발주금액이 소액임
- 3건의 사업이 유사 공종의 도로 사업으로써, 개별 공사시행시는 업무 및 행정 효율성 저하가 예상됨.

○ **통합 공사발주 추진계획**

- 입찰방법 : 일반경쟁입찰
- 추진일정
 - 2015. 04. 07 : 일상감사시행
 - 2015. 04. 09 : 공사발주
 - 2015. 04. 23 : 착공
 - 2015. 10. 22 : 준공

○ **발주계획**

공 사 명	사 업 명	공 사 규 모	발주금액 (천원)	비고
총 계	3건 통합발주		380,000	
마장동399주변 외 2개소 도로공사	마장동 399 주변 도로 개설공사	· 도로개설 B=6m, L=70m	313,000	· 예산액 : 600,000 · 기 집행액 : 193,943
	성수동 1가 롯데서울숲 IT캐슬 진입로 가각 정비공사	· 도로 가각정비 B=4m→6m, L=15m · 도로 편경사 정비 L=30m	24,500	· 예산액 : 50,000 · 지장물 이설비 6개소×3,000=18,000 · 예산유보액 15% 50,000×15%=7,500
	옥수교회앞 도서당로 진입도로 확장공사	· 기타 부대공 1식	42,500	· 예산액 : 50,000 · 예산유보액 15% 50,000×15%=7,500

○ **예산과목**

- 토목과, 지방도건설및확대포장, 도로건설사업, 마장동399주변 도로개설공사, 시설비및부대비, 시설비
- 토목과, 지방도건설및확대포장, 도로건설사업, 성수1가2동 롯데서울숲 IT캐슬 진입로 확장, 시설비및부대비, 시설비
- 토목과, 지방도건설및확대포장, 도로건설사업, 옥수교회 옆 도서당로 급경사 진입도로 정비, 시설비및부대비, 시설비

행정사항

- 분전함 이설은 토목과 조명팀 연간단가공사에 포함 시행.
- 폐기물처리는 기 발주된 “성수1로 주변 도로 및 관거정비 건설폐기물 처리용역”에 포함 시행. 끝.
