


<제3안>



수 신 : 수신처참조

제 목 : 도시계획사업(도로, 광장) 실시계획 변경인가 통보

1. 한국토지개발공사 본사(개) 1911-10596('92. 11. 9)호와 관련임.

2. 도시계획사업(도로, 광장) "내국-분당간 도시고속도로 건설사업"의 실시계획변경인가를 도시계획법제25조 및 제26조와 동법시행령 제6조 및 제27조의 규정에의거 별첨 고시문과 같이 변경인가 및 고시하였기 통보하니 업무에 참고할것.

첨 부 : 고시문1부 끝

서울특별시

수신처: 한국토지개발공사, 도로계획과장,

<제4안>

수 신 : 홍보계획담당관


제 목 : 시보게재의뢰


도시계획사업(도로, 광장) 실시계획 변경인가한 "내국-분당간 도시고속도로 건설사업"의 고시문(서울시고시 제1992- 호)을 별첨과같이 시보에 게재하여 주시기 바랍니다.

첨 부 : 고시문사본2부 끝.



건설행정과장





도시계획사업 (도로, 광장) 실시계획 변경인가

1. 서울시고시 제120호('91. 4. 30)로 도시계획사업(도로, 광장)시행허가한 "내국-분당간 도시고속도로 건설사업"에 대하여 도시계획법 제25조 및 동법시행령 제6조 규정에서의 실시계획변경인가하였기 동법 제26조 및 동법시행령 제27조의 규정에 의하여 다음과같이 고시합니다.
2. 관계도서는 한국토지개발공사(분당사업처)에 비치하고 토지등소유자,와 이해관계인 에게 보입니다.

1992. 12. .

서울특별시

가. 사업시행지 : 서초구 내곡동 일원

나. 사업의 종류 및 명칭

- 종류 : 도시계획사업(도로, 광장)
- 명칭 : 내국-분당간 도시고속도로 건설사업

다. 사업시행자 : 강남구 논현동 71-2 한국토지개발공사사장


라. 사업규모 : 도로신설 B = 29 - 45M , L = 2,475M
 도로확장 B = 29-30M → 50M , L = 1,040M
 광장신설면적 155,320 m²

마. 사업의 착수 및 준공예정일 : 당 초 : '91. 4. 30 - '92. 12. 31
 변경 : '91. 4. 30 - '94. 12. 31


- 변경내용 : 절대공기부족으로인한 사업기간연장

바. 사용 또는 수용할 토지 및 지장물의 소재지, 지번, 지목, 자적, 소유권이외의 권리 명세서 : 변경없음

사. 토지 및 건물 소유자와 토지수용법제4조 제3항에 의한 관계인의 주소성명 : 변경없음



위 치 도

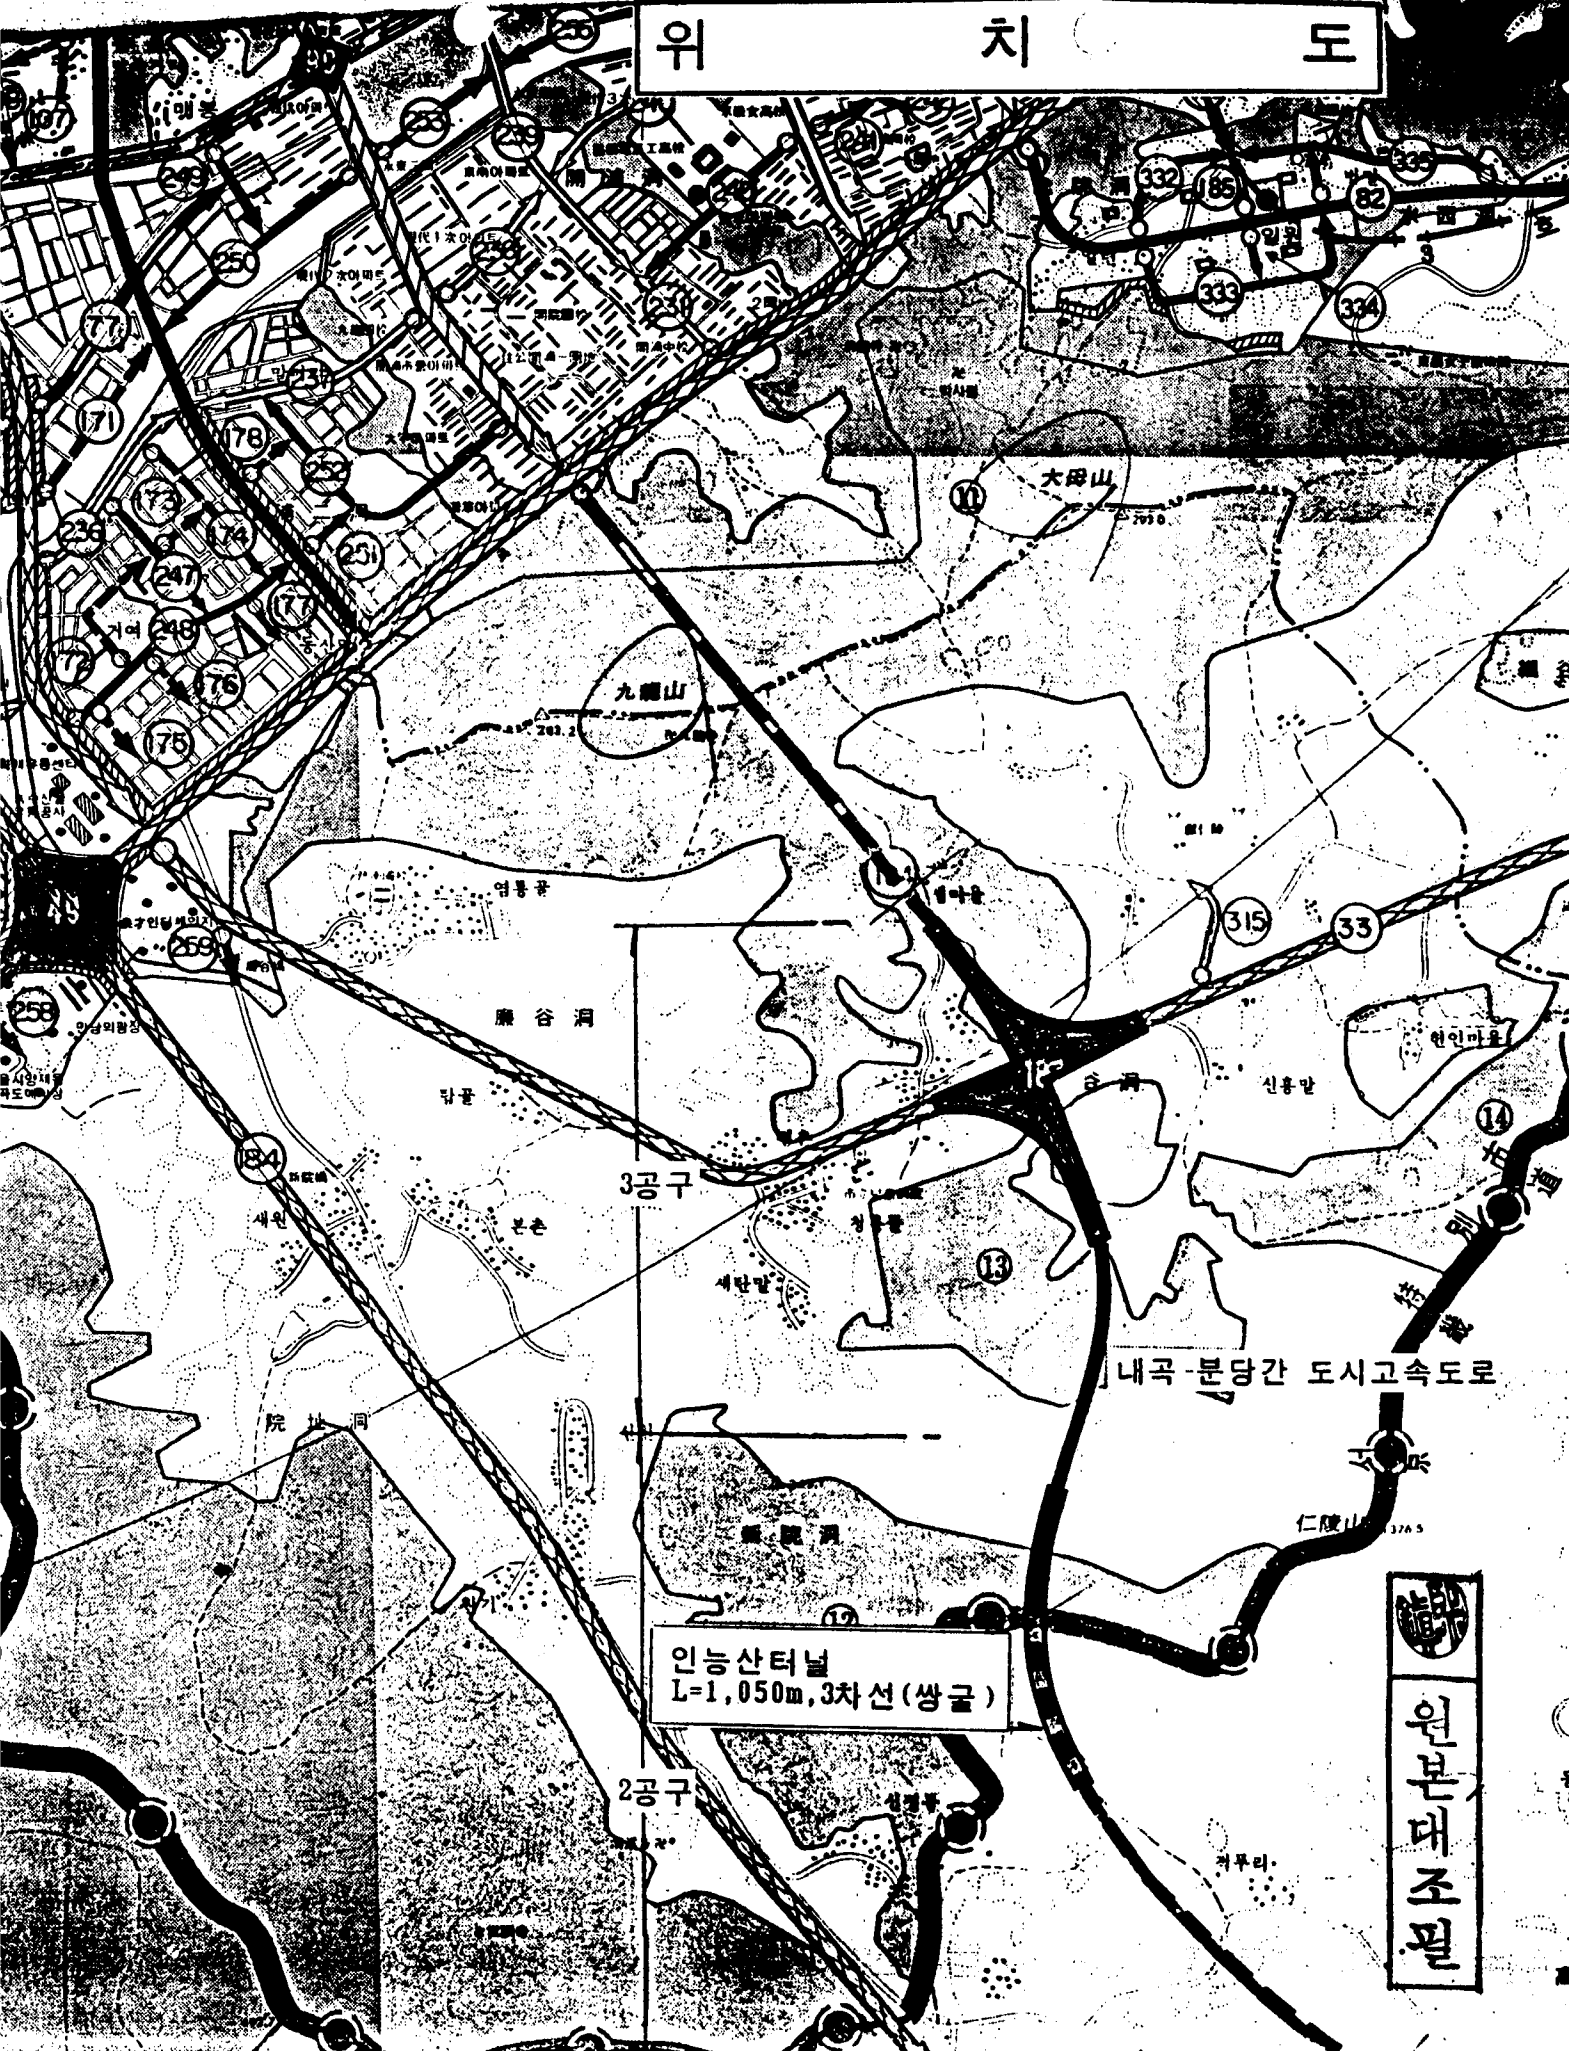

인능산터널
L=1,050m, 3차선(쌍굴)

내곡-분당간 도시고속도로

원본대조필

도시계획사업(도로, 광장) 실시계획 변경인가신청서

○ 사업시행지 : 서초구 내곡동 일원

○ 사업의종류 및 명칭

종 류 : 도시계획사업(도로, 광장)

명 칭 : 내곡 분당간 도시고속도로 건설사업

○ 사업의규모 도로신설 B = 29.45M, L = 2,475M

도로확장 B = 29.30M 50M, L = 1,040M

광장상설면적 155,320


○ 사업시행자 : 한국토지개발공사사장

○ 사업시행기간 당 초 : '91. 4. 30 - '92. 12. 31

변 경 : '91. 4. 30 - '94. 12. 31

변경내용 : 인능산터널공사의 절대공기부족으로 인한 사업기간연장

○ 기 타 변경사항없음.



한 국 토 지 개 발 공 사

본사(개)1911- 11074

1992. 11. 21.

수신 서울특별시장


참조 건설행정과장

제목 내국-분당간 실시계획변경인가 신청 보완

1. 건행 30314-2610('92.11.13)호와 관련입니다.
2. 내국-분당간 도시고속도로(서울시 구간) 건설사업 실시계획변경인가 신청을 별첨과 같이 보완 제출하오니 조치하여 주시기 바랍니다.


첨부 1. 실시계획변경인가 신청서 2부.

2. 변경사유서 2부.



결	과장	김민	계장	최
일시	1992. 11. 23	분	37	
(3)				
과				

한 국 토 지 개 발 공 사 사



한국토지개발공사 건설규정 제29조 제1항의
규정에 의하여 분당사업처장전권

원본대조


내곡 - 분당간 (서울시구간) 사업기간 변경사유서

■ 내곡 - 분당간 도시고속도로 (서울시구간)은 '91. 4.30 (서울시고시 제120호) 실시계획 인가를 득하여 '92.12.31 사업준공 예정으로 추진중이나 아래와 같은 사유로 인하여 사업기간 (2년) 연기를 요청합니다

- 동 노선의 2공구(분당기점 5.9 ~ 8.8km)는 동 공구내 인능산터널 (L=1,050m, 3차선, 쌍굴) 절대공기를 감안하여 '91. 6.24 공사착수하여 '94. 3.23 공사 준공예정으로 추진중이며
- 3공구 (분당기점 8.8 ~ 10.4km)은 '91. 7. 1 공사착수하여 '93. 1.31 공사 준공예정으로 추진중 내곡광장 부근의 공용의청사거림 착수에 따라 관계기관 기관 협의로 인하여 '91.12.24 부터 '92. 8. 2까지 공사가 중지된 바 있어 '93. 12 공사 준공예정으로 기타 조경, 가로등 공사기간의 순연

■ 추진경위

- '90.12.17 : 분당-내곡간(서울시구간)도시계획시설 결정(건설부고시 제899호)
- '91. 4.30 : 분당-내곡간 (서울시구간) 도시고속도로 건설사업 실시계획인가
- '91. 6.24 : 분당-내곡 2공구 공사착공 (예정공정표 별첨)
- '91. 7. 1 : 분당-내곡 3공구 공사착공
- '93.12.31 : 분당-내곡 3공구 공사 준공예정
- '94. 3.23 : 분당-내곡 2공구 공사 준공예정



내곡 - 분당간 (서울시구간) 사업기간 변경사유서


■ 내곡 - 분당간 도시고속도로 (서울시구간)은 '91. 4.30 (서울시고시 제120호) 실시계획 인가를 득하여 '92.12.31 사업준공 예정으로 추진중이나 아래와 같은 사유로 인하여 사업기간 (2년) 연기를 요청합니다

· 동 노선의 2공구(분당기점 5.9 ~ 8.8km)는 동 공구내 인능산터널 (L=1,050m, 3차선, 쌍굴) 절대공기를 감안하여 '91. 6.24 공사착수하여 '94. 3.23 공사 준공예정으로 추진중이며

· 3공구 (분당기점 8.8 ~ 10.4km)은 '91. 7. 1 공사착수하여 '93. 1.31 공사 준공예정으로 추진중 내곡광장 부근의 공용의청사건립 착수에 따라 관계기관 협의로 인하여 '91.12.24 부터 '92. 8. 2까지 공사가 중지된 바 있어 '93. 12 공사 준공예정으로 기타 조경, 가로등 공사기간의 순연

■ 추진경위

- '90.12.17 : 분당-내곡간(서울시구간)도시계획시설 결정(건설부고시 제893호)
- '91. 4.30 : 분당-내곡간 (서울시구간) 도시고속도로 건설사업 실시계획인가
- '91. 6.24 : 분당-내곡 2공구 공사착공 (예정공정표 별첨)
- '91. 7. 1 : 분당-내곡 3공구 공사착공
- '93.12.31 : 분당-내곡 3공구 공사 준공예정
- '94. 3.23 : 분당-내곡 2공구 공사 준공예정



서울특별시

☎ 100-744 서울.중구 태평로1가 31 / 전화 (02)731-6373 / 전송 (02)731-6374

#####

문서번호: 건행 30314 - 2610

시행일자 '92.11.13

경 유

수 신 한국토지개발공사 사장

참 조 분당사업처장

취급		시 장
보존		
국 장		
과 장	(권결)	
계 장	김	
기안	정의진	
		협조

제 목 도시계획사업 실시계획 변경인가신청에 따른 보완요구

1. 한국토지개발공사 분사(개)1911-10596('92.11.6)호와 관련임.


2. 도시계획사업 "내곡-분당간 도시고속도로(서울시구간)" 실시계획변경인가 신청서내용

을 검토한바 아래와같이 미비사항이 있어 보완요구하니 제출하여 주시기 바랍니다.

보 완 내 용

가. 변경인가신청서 2부.

나. 변경사유서 2부. 끝.



서울특별시 장

한국토지개발공사

본사(개) 1911 - 10196

1992. 11. 6.

수신 서울특별시장

참조 건설행정과장



제목 내국-분당간 실시계획 변경인가(사업기간변경) 신청

1. 건행 30500 - 642('91.4.30)호와 관련입니다.
2. 내국-분당간 도시고속도로 건설사업 실시계획인가 내용중 사업기간을 별첨과 같은 사유로 아래와 같이 변경요청하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

구 분	당 초	변 경	비 고
사업기간	'91. 4.30 - '92.13.31	'91. 4.30 - '94.12.31	

첨 부 : 사업기간 변경사유서 1부.

한국토지개발공사 사



내곡 - 분당간 (서울시구간) 사업기간 변경사유서

=====

■ 내곡 - 분당간 도시고속도로 (서울시구간)은 '91. 4.30 (서울시고시 제120호) 실시계획 인가를 득하여 '92.12.31 사업준공 예정으로 추진중이나 아래와 같은 사유로 인하여 사업기간 (2년) 연기를 요청합니다

· 동 노선의 2공구(분당기점 5.9 ~ 8.8km)는 동 공구내 인능산터널 (L=1,050m, 3차선, 쌍굴) 절대공기를 감안하여 '91. 6.24 공사착수하여 '94. 3.23 공사 준공예정으로 추진중이며

· 3공구 (분당기점 8.8 ~ 10.4km)은 '91. 7. 1 공사착수하여 '93. 1.31 공사 준공예정으로 추진중 내곡광장 부근의 공용의철사건립 착수에 따라 관계기관 기관 협의로 인하여 '91.12.24 부터 '92. 8. 2까지 공사가 중지된 바 있어 '93. 12 공사 준공예정으로 기타 조경, 가로등 공사기간의 순연

■ 추진경위

- '90.12.17 : 분당-내곡간(서울시구간)도시계획시설 결정(건설부고시 제899호)
- '91. 4.30 : 분당-내곡간 (서울시구간) 도시고속도로 건설사업 실시계획인가
- '91. 6.24 : 분당-내곡 2공구 공사착공 (예정공정표 별첨)
- '91. 7. 1 : 분당-내곡 3공구 공사착공
- '93.12.31 : 분당-내곡 3공구 공사 준공예정
- '94. 3.23 : 분당-내곡 2공구 공사 준공예정

