

에 코

☎ 03402 / 서울시 은평구 진흥로1길45, 204호 / 전화 (02)388-9464 / 전송 (02)385-2975

문서번호 : 20180129-01 호

발송일자 : 2018. 01. 29.

받 음 : 서울주택도시공사

참 조 : 계약부, 시설활용부

선람	후장 백 영 3	지시	
접수	일 자	결재	
	시 간		
	2018. 01. 29.	공람	
	16:49		
	번호		
	310		
처리과	시설활용부		
담당자	안병구		
심사자		심사일	

제 목 : 공사기한연장 신청의건

1. 귀 공사의 무궁한 발전을 기원합니다.
2. 계약번호 201801036C2-00(2018.01.09.) “가양4단지 개별 경비실 환원 전기공사”
3. 위 공사와 관련하여 공사 중 공종간 공사 일정 협의 등으로 인하여 불가피하게 공사기한의 연장이 필요하여 신청하오니 검토 후 조치하여 주시기 바랍니다.


변경전 공사기한	변경후 공사기한
2018년01월12일 ~ 2018년01월31일	2018년01월12일 ~ 2018년02월19일

붙임 1. 공기연장 사유서 1부.

에 코 대 표 이 사 이 덕



공 사 기 한 연 기 원

감독확인 : 

공 사 명 : 가양4단지 개별 경비실 환원 전기공사
계 약 금 액 : 일금오천사백삼십사만구천삼십이원정(W54,349,032)
계 약 년 월 일 : 2018년 01월 09일
계약상 착공일 : 2018년 01월 12일
준 공 예 정 일 : 2018년 01월 31일
연 기 요 청 일 : 2018년 02월 19일
연 기 사 유 : 경비실 가구 반입 일정 및 소방 간선 수정 등으로 인한 연기.
첨 부 : 연기사유서 외 증빙서류 일체.

2018년 01월 29일

수 급 인 주 소 : 서울시 은평구 진흥로1길45-0
상 호 : 에 코
대표자 : 이 덕 순 (인)



서울주택도시공사 사장 귀하

공기 연장 사유서

공 사 명 : 가양4단지 개별 경비실 환원 전기공사

공사기간 : 2018년01월12일 ~ 2018년02월19일

당초 공사 준공일은 2018년 1월 31일 이었으나, 공사 진행중 공종간 공사 일정 진행에 아래와 같이 지연 사유가 발생하여 공사 준공일을 연장 요청합니다.

(표1-1)

단지명	공사지연사유	변경 준공일	비고
가양4단지	1.소화전 및 세대간 소방 선로에 단선 등 이상 신호 발생으로 선로 보수 공사를 선행하기 위한 공사기간 필요. (소방서 준공 검사기 점검 사항) 2. 경비실 가구 등이 전기공사 준공일 이후 납품 예정임.	2018.02.19	19일 연기

첨부서류 : 1.화재 수신반 이상 신호 리스트 및 사진대지 . 끝

2018년 01월 29일

에 코 대표이사 이 덕 순


- 가양 4단지 화재 수신반 오작동 리스트 -



- 가양 4단지 화재 수신반 주요 이상 신호 리스트 -


404동	410동
B1 1호라인 경종	1층 1호라인 감지기
B1 2호라인 회로	4층 1,2호라인 감지기
B1 2호라인 경종	6층 2호라인 감지기
B1층 1,2호라인 감지기	8층 1,2호라인 감지기
3층 1호라인 감지기	9층 2호라인 감지기
6층 1호라인 감지기	10층 2호라인 감지기
8층 2호라인 감지기	11층 2호라인 감지기
405동	12층 1,2호라인 감지기
4층 회로	13층 1,2호라인 감지기
5층 회로	14층 1,2호라인 감지기
14층 회로	411동
7층 감지기	4층 2호라인 감지기
10층 감지기	9층 1호라인 감지기
11층 감지기	10층 1호라인 감지기
12층 감지기	14층 1,2호라인 감지기
13층 감지기	412동
406동	3층 2호라인 감지기
계단 감지기	10층 1,2호라인 감지기
E/V 감지기	11층 1호라인 감지기
2층 1호라인 감지기	413동
5층 1호라인 감지기	1층 2호라인 회로
8층 1호라인 감지기	5층 1호라인 회로
408동	7층 1호라인 회로
1층 경종	9층 1호라인 회로
1층 감지기	10층 1,2호 라인 회로
12층 감지기	11층 1호라인 회로
409동	4층 1,2호라인 경종
11층 회로	5층 1,2호라인 경종
1층 감지기	10층 1호라인 경종
5층 감지기	1층 1호라인 감지기
12층 감지기	3층 2호라인 감지기
	5층 2호라인 감지기
	7층 2호라인 감지기
	15층 2호라인 감지기

- 가양 4단지 화재 수신반 주요 이상 신호 사진대지 -

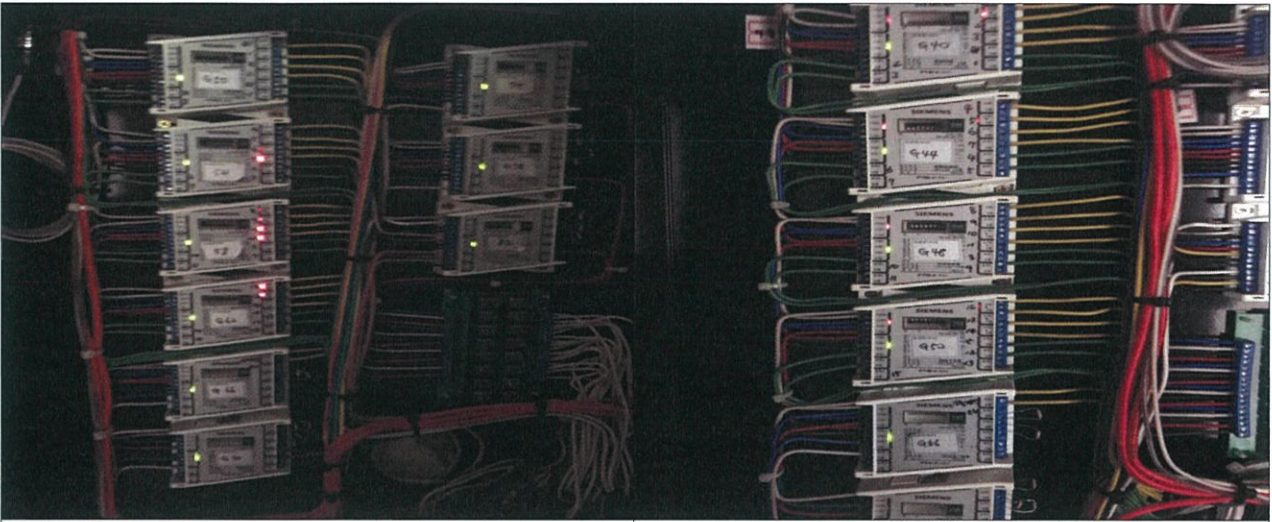


적색램프 점등 오동작

적색램프 점등 오동작

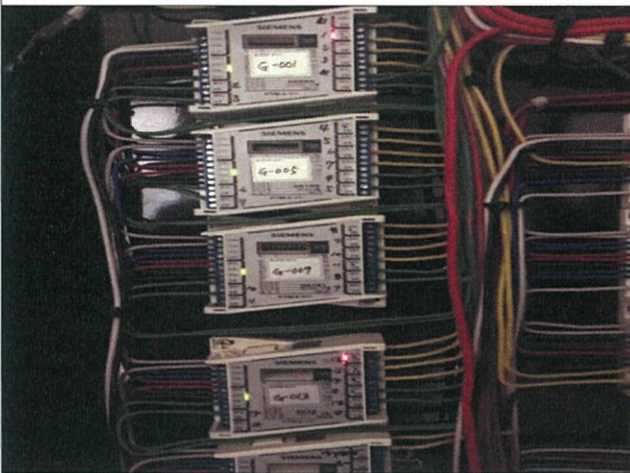


적색램프 점등 오동작

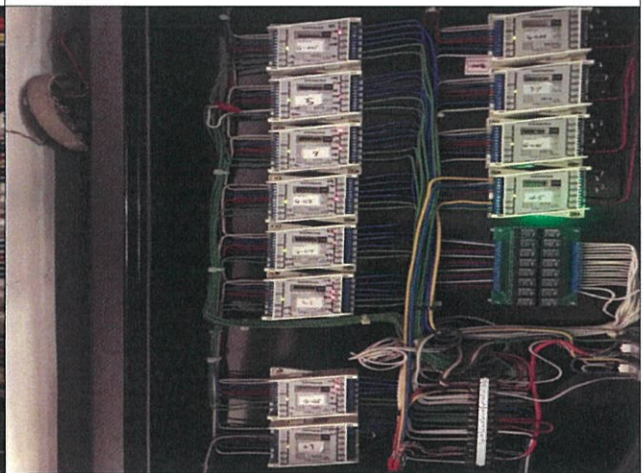

적색램프 점등 오동작



적색램프 점등 오동작

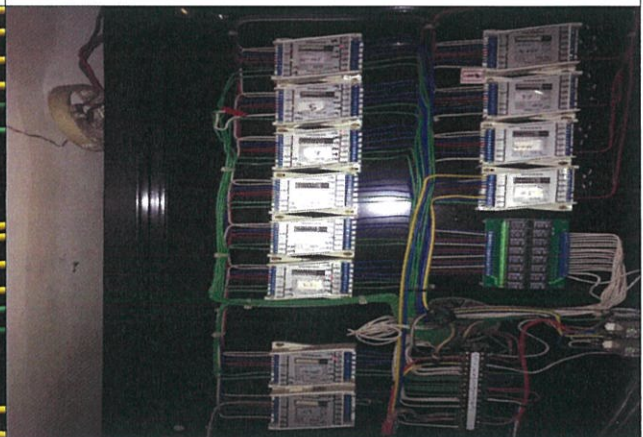

적색램프 점등 오동작

변경 합의서

계약번호	201801036C2-00	공고 번호	
건 명	가양4단지 개별 경비실 환원 전기공사		

당사는 서울주택도시공사와 계약 체결하여 계약이행 중에 있는 상기 공사, 용역(물품)계약에 대하여 다음과 같이 계약내용이 변경됨에 합의하고 하등의 이의를 제기치 않고 계약자로서의 의무를 성실히 이행할 것을 약속합니다.

합 의 내 용

준공기한 변경

계약금액 변경

당 초: 2018. 01. 31.

당초금액 : ₩54,349,032

변경후: 2018. 02. 19

변경금액 : ₩54,349,032

증 감 : 변경없음

계약자

주 소 : 서울시 은평구 진흥로1길45-0, 204호

상 호 : 에코

대표이사 : 이덕순

(인)

계약자

주 소 : 서울시 영등포구 양평로5, 7층

(공동이행)

상 호 : ㈜경동하우징

대표이사 : 송득중

(인)

서울주택도시공사 사장 귀하
