

## 돈화문로 전통문화시설 건립

돈화문 전통문화시설 건립을 통해 국내외 관광객 유치 및 전통문화 교육·체험의 장으로 활용, 돈화문로의 구심점 역할을 할 수 있는 거점시설로 조성코자 함

### 예산 총괄

(단위 : 백만원)

2014예산 (A)	2015예산 (B)	증감 (B-A)	(B-A)*100/A
2,000	2,257	257	12.9%

### 사업 설명

(단위 : 백만원)

#### 사업목적

- 창덕궁 돈화문 앞 전통문화시설 건립으로 국내외 관광객 유치 및 전통문화 교육·체험의 장으로 활용, 돈화문 전통문화시설이 돈화문로의 구심적 역할을 할 수 있는 거점 시설로 조성

#### 사업근거

- 기타 근거(방침, 지침 등)
  - 돈화문지역 전통문화 보존 육성계획('08.11.13 )
  - 돈화문로 전통문화시설 건립계획 수립( '09.5.24)

#### 사업내용

- 위 치 : 종로구 와룡동 5-9외 8필지
- 규 모 : 부지 1,866.8㎡ 연면적 3,304.31㎡
- 사업기간 : 2009.05. ~ 2016.12.
- 사업내용 : 돈화문국악예술당 / 전통문화전시관
- 총사업비 : 45,686백만원 (국비 11,087 / 시비 34,599)

#### 2015년도 사업계획

- 위 치 : 종로구 와룡동 5-9외 8필지
- 사업규모 : 부지 1,523㎡ 연면적 3,231㎡(돈화문국악예술당 / 전통문화전시관)

○ 사업내용

- 돈화문국악예술당

- 토지면적 : 845.6㎡
- 연 면 적 : 1,778㎡, 지상1/지하3층
- 용 도 : 공연장, 국악마당, 연습실, 대기실, 사무실, 카페테리아 등

- 전통문화전시관

- 토지면적 : 678.2㎡
- 연 면 적 : 1,453㎡, 지상1/지하2층
- 용 도 : 기획전시실 상설전시실, 체험전시실, 휴게카페, 사무실 등

□ 추진경위

- 돈화문지역 전통문화 보존 육성계획(시장방침 제647호) : '08.11
- 돈화문로 전통문화시설 건립계획 수립(문화국장방침 제279호) : '09.5월
- 시의회 공유재산 관리계획 : '09. 8월
- 국고보조금 지원 협의 및 중앙투자심사 : '09. 10월
- 실시계획 공람공고 : '10. 7월
- 보상계획 열람공고 : '10. 9월
- 설계경기공모 심사 및 당선작 결정 : '11. 8월
- 실시설계용역 준공 : '12. 8월
- 전체 사업부지 소유권 이전 등기완료 : '12.10월
- 전통문화시설 운영 및 구축방안 용역완료 : '12. 8. ~ '13. 4월
- 국악예술당 건립계획 수립 : '13. 8월
- 국악예술당 운영사무의 민간위탁 동의안 가결 : '14. 4월
- 국악예술당 부지 문화재 조사 완료 : '14. 5월
- 국악예술당 건립 착공 : '14. 12월

□ 2015년도 예산

구분	2013결산	2014예산(A)	2015예산(B)	증감(B-A)
계	(×47) 109	(×-) 2,000	(×-) 2,257	(×-) 257
시 설 비	(×47) 47	(×-) 1,565	(×-) 1,841	276
감 리 비	-	360	416	56
시설부대비	3	75	-	△75
연구용역비	59	-	-	-

2015년도 예산 산출 근거

- 시설비 : 1,841백만원 (공사비 8,741 - '14년 확보예산 6,899)
  - 공사비 8,741백만원
  - '14년 확보예산 6,899백만원
- 감리비 : 416백만원
  - 국악예술당 240백만원
  - 전통문화전시관 176백만원

사업추진 절차

- 집행절차
  - 예산편성 → 공사계약(서울시-시공업체) → 공사시행 → 사업완료
- 계약체결
  - 장기계속공사, 단독 또는 공동 도급
  - 공개경쟁입찰
  - 관리감독 : 책임감리

사업효과

- 연도별 사업추진 실적

2012년도	· 실시설계용역 준공 · 건립부지 소유권 이전 완료
2013년도	· 돈화문로 전통문화시설 운영 및 디지털 콘텐츠 구축방안 연구용역 완료 · 시공사 선정 등 발주계약 · 추가편입지 내 지장물 철거 등 착공
2014년도	· 국악예술당 건립부지 문화재 조사 완료 · 건립공사 추진(약 3%)

- 향후 기대효과
  - 돈화문 지역의 전통문화 공간창출을 통한 문화관광자원으로서의 거점화
  - 교육 및 체험공간 기회제공에 따른 전통문화 계승·발전 기대

사전절차 이행 여부

<사전절차 이행여부>

구분	투자 심사	학술 용역	정보화 예비 심사	홍보· 간행물 심의	기술 심사	공유재산 심의	축제·행사성 경비	민간 이전 경비
해당 여부	○	○	×	×	○	○	×	×
심의 일자	2009.10.20	2012.08.12	-	-	2008.10.16	2011.07.22	-	-

<사전절차 이행결과>

- 기술심사 (2008.10.16) : 적정
- 중앙투자심사(2009.10.20) : 적정
- 공유재산심의(2011.07.22) : 적정
- 학술용역(2012.08.12.) : 적정

2015년도 추진방향 및 추진일정

- 추진방향
  - 돈화문국악예술당 건립추진 (공정률 85%)
  - 전통문화전시관 건립추진 (공정률 10%)

- 추진일정(단위 : 백만원)

사업추진절차	추진기간	예산집행계획	추진세부내용
계		2,287	
국악예술당 공사 추진	2015.1월~	2,287	공정률 85%
전통문화전시관 착공준비	2015.1월~		문화재 조사 및 착공 등

※ 총사업비 투자현황 및 계획(단위 : 백만원)

구분	계	기투자 (~2013)	2014	2015	2016	비고
소 계	45,686	20,484	7,483	2,257	15,432	
시설비	(×11,087) 44,114	(×3,488) 20,360	(×5,334) 6,899	(×-) 1,841	(×-) 15,014	
설계비	805	805	-	-	-	
공사비(시설비)	24,241	487	6,899	1,841	15,014	
토지매입비	19,068	19,068	-	-	-	
감리비	1,200	-	509	-	143	
시설부대비	254	6	75	416	275	
연구용역비	118	118	-	-	-	

※ 총사업비 변경내역(단위 : 백만원)

구분	확정·변경 연도	총사업비		사업기간		확정·변경사유 및 내역
		당초	변경	착수연도	완료연도	
최초	2009	43,788	-	-	-	
(1)차 변경	2011	43,788	44,500	-	-	물가상승률 등 반영
(2)차 변경	2012	44,500	45,686	-	-	편입지 보상금 등 반영
2015년도 요구	2014	45,686	-	2013	2016	

### 집행결과

(단위 : 백만원)

최근 3년간 이·전용, 이용·불용 실적

연도	당초예산 (A)	전년이월 (B)	이·전용 (C)	예산현액 (A+B+C)	집행	차년이월 (명사·사고)	불용
2011	1,040	19,137	-	20,177	16,200	526	3,451
2012	8,978	526	△2,366	7,138	4,030	3,701	37
2013	2,678	3,071	-	5,749	109	5,483	157


실·본부·국	부서명	담당자			
		문화체육관광 본부	문화정책과	문화시설팀장	이영미 (2133-2533)

본 사업과 관련하여 자세한 계획서는 아래 홈페이지에서  
내려받기 하실 수 있습니다.

<http://opengov.seoul.go.kr/sanction>

## 참 고 자 료

### 위 치 도

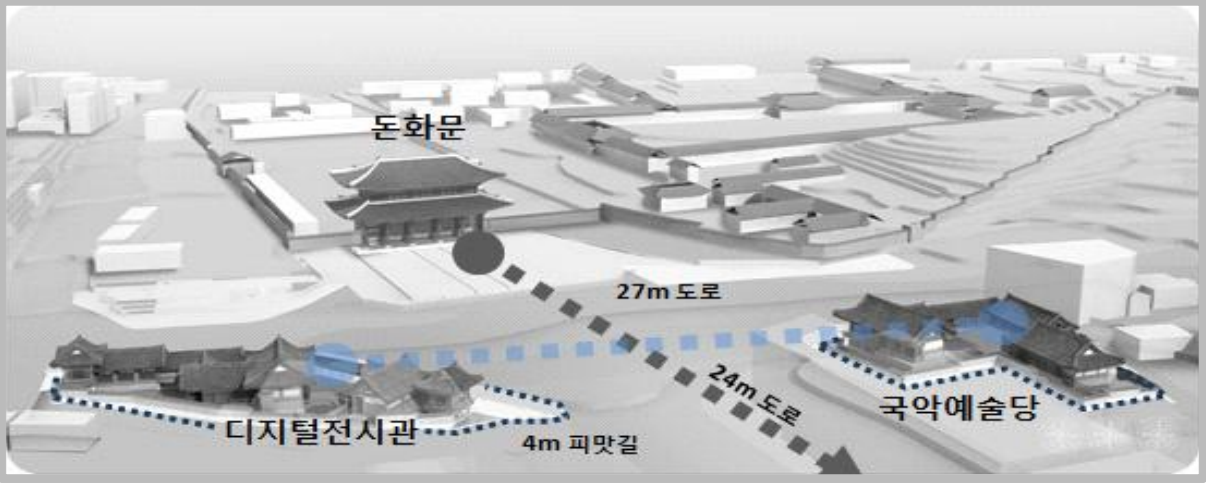

### 단계별 공사 계획

- 국악예술당
  - '14. 9월 ~ 12월            굴토공사
  - '15. 1월 ~ 4월            골조공사
  - '15. 4월 ~ 11월          한옥공사 및 내부 수장공사
  - '15. 7월 ~ 10월          도장 및 외부 조경공사
  - '16. 2월                    돈화문 국악예술당 준공
- 전통문화전시관
  - '15.1월 ~ 6월            착공준비 및 문화재 발굴조사
  - '15. 7월 ~ 12월          터파기 및 흙막이 공사

### 공사 조감도



<전통문화전시관>



<돈화문국악예술당 >
