

ERP(경영관리) 및 전자결재시스템 고도화 사업 서비스 오픈 및 교육 계획 보고(일정변경)

2016. 06. 27.

문서번호	전산정보팀-829	주임	팀장	본부장	단장	대표이사
결재일자	2017.06.30.	06/27 장기영	06/28 노태화	06/28 강문석	06/30 유석윤	06/30 이근
공개여부	공개	협 조	팀장	팀장	팀장	본부장
방침번호			06/27 代서혜영	06/27 지서해	06/28 이상목	06/28 박진배

추진근거	<ul style="list-style-type: none"> - ERP(경영관리) 및 전자결재시스템 고도화 연계 구축 사업(대표이사방침 제3183호,2016.10.19) - ERP(경영관리) 및 전자결재시스템 고도화 연계 구축 사업 적격 심사위원회 결과 보고(대표이사방침 제3690호,2016.12.02.) - ERP(경영관리) 및 전자결재시스템 고도화 연계 구축 사업 계약체결 의뢰(시설관리팀3917,2016.12.08.) - ERP(경영관리) 및 전자결재시스템 고도화 연계 구축 사업 착수보고회 개최 결과보고(대표이사방침 제114호, 2017.01.13.) - ERP(경영관리) 및 전자결재시스템 고도화 연계 구축 사업 중간보고회 결과보고(대표이사방침 제1013호, 2017.03.21) 		
대 내 외 협력현황	부서(단체)명	협약내용	협약결과
	기획경영팀	예산, DDP운영현황, 사업체계관리	요구사항 개발 체크(1, 2차 검수) 및 실무자 교육 참여
	경영지원팀	회계, 인사, 급여, 근태, 고정자산, 특근매식비	
국제협력팀	네트워크관리		
사 업 비	-		

서울디자인재단 (전산정보팀)

사전 검토항목

※ 해당사항이 없을 경우 '무 ✓' 표시하시기 바랍니다.


검 토 항 목	검토여부 '✓' 표시
시 민 참 여 고 려 사 항	시 민 : 유 <input type="checkbox"/> () 무 <input checked="" type="checkbox"/>
	이 해 당 사 자 : 유 <input type="checkbox"/> () 무 <input checked="" type="checkbox"/>
	전 문 가 : 유 <input type="checkbox"/> () 무 <input checked="" type="checkbox"/>
	옴 브 즈 만 : 유 <input type="checkbox"/> () 무 <input checked="" type="checkbox"/>
법령및기타 고 려 사 항	법 령 규 정 : 교통 <input type="checkbox"/> 환경 <input type="checkbox"/> 재해 <input type="checkbox"/> 기타 <input type="checkbox"/> 무 <input checked="" type="checkbox"/>
	고용효과 <input type="checkbox"/> 노동인지 <input type="checkbox"/> 균형인지 <input type="checkbox"/>
	기 타 : 취약계층 <input type="checkbox"/> 성인지 <input type="checkbox"/> 장애인 <input type="checkbox"/> 디자인 <input type="checkbox"/>
	갈등발생 가능성 <input type="checkbox"/> 유지관리 비용 <input type="checkbox"/> 무 <input checked="" type="checkbox"/>
타 자 원 의 활 용	중 앙 부 처 : 유 <input type="checkbox"/> () 무 <input checked="" type="checkbox"/>
	민 간 단 체 : 유 <input type="checkbox"/> () 무 <input checked="" type="checkbox"/>
	기 업 : 유 <input type="checkbox"/> () 무 <input checked="" type="checkbox"/>
관 계 기 관 및 단체 협의	관 계 기 관 : 유 <input type="checkbox"/> () 무 <input checked="" type="checkbox"/>
	관 련 단 체 : 유 <input type="checkbox"/> () 무 <input checked="" type="checkbox"/>

ERP(경영관리) 및 전자결재시스템 고도화 사업 서비스 오픈 및 교육 계획 보고(일정변경)

ERP(경영관리) 및 그룹웨어(전자결재) 시스템 고도화 연계 구축 사업의 마무리 단계로서 개발 완료된 서비스에 대한 사용자 테스트(검수) 계획, 교육 계획, 서비스 오픈 일정 등을 보고하고자 함.

1. 개 요

- 서비스 오픈 및 교육 일정(변경)

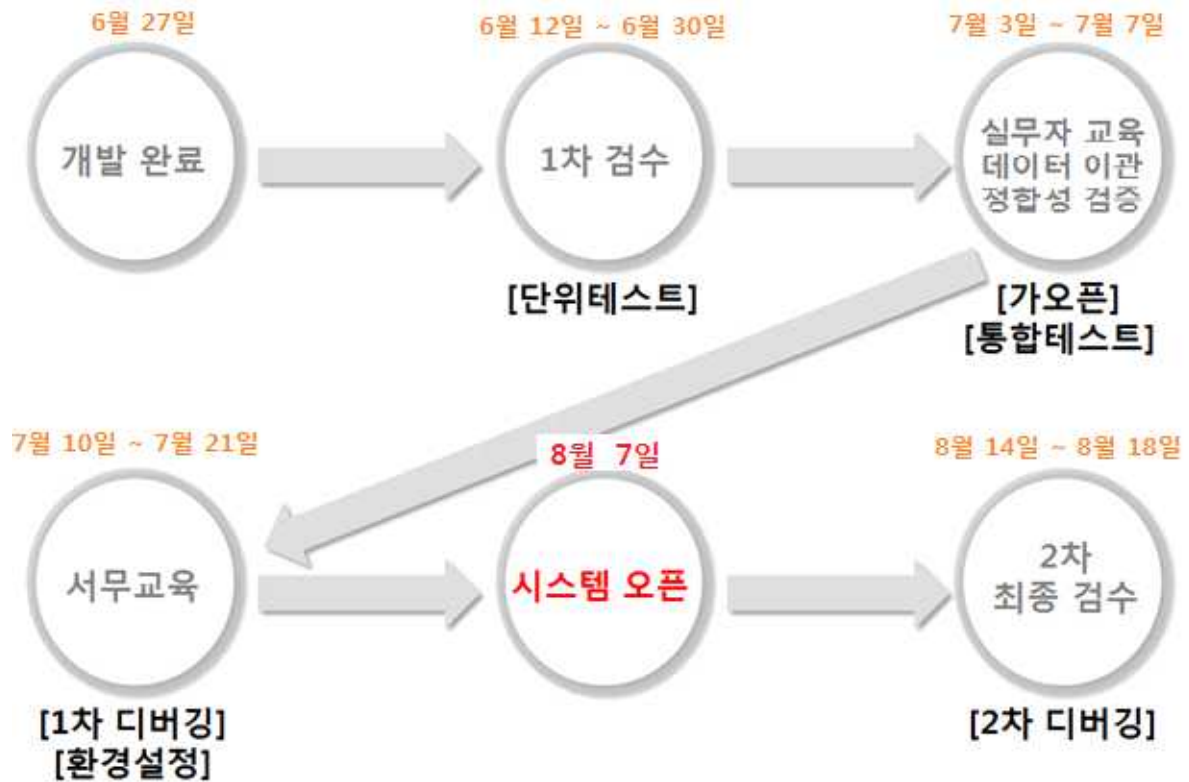

※ ERP(경영관리) 및 전자결재시스템 고도화 연계 구축 사업

- 사업기간 : 2016.12.21. ~ 2017.08.21. (8개월)
- 사업목적 : 인사, 회계, 사업관리 등 업무 효율성 증대 및 경영관리 데이터 아카이빙
- 사업수행 : (주)더존비즈온, (주)하람아이 컨소시엄
- 사업비 : 339,000천원(VAT 포함)(변동 없음)

2. 목 적

1. 사용자 테스트(검수)

- 단위 및 통합 테스트(가오픈 기간)를 통해 신규 구축된 시스템의 오류 및 취약점을 사전에 수정하여 시스템 완성도 향상

2. 교육

- 예산, 회계, 인사, 사업관리 등 개별 실무자 및 전직원 교육을 통한 신규 기능 활용 능력 향상

3. 서비스 오픈

- 가오픈(Preview) 기간을 두어 전직원이 자유롭게 테스트함으로써 신규 시스템에 대한 친숙도 향상 및 기능 개선

3. 내 용

1. 사용자 테스트(검수) 계획

- 단위 테스트
 - 기간 : 2017.06.12.(월) ~ 2017.06.30.(금)
 - 내용 : 예산, 회계, 인사, DDP운영현황, 사업체계관리, 경영현황관리, 근태, 급여, 특근매식비, 네트워크관리, 고정자산관리 등 개별기능 테스트
- 통합 테스트
 - 기간 : 2017.07.03.(월) ~ 2017.07.07.(금)
 - 내용 : 품의서(원인행위) 및 회계결의서, 근태, 사업체계관리 등 전직원 사용하는 전체 기능의 연계 구성 테스트

2. 교육 일정

- 실무자 교육
 - 1차 : 2017.07.03.(월) ~ 2017.07.07.(금)
 - 2차 : 2017.07.10.(월) ~ 2017.07.14.(금)
- 서무 교육
 - 1차 : 2017.07.17.(월) ~ 2017.07.21.(금)
 - 2차 : 2017.07.24.(월) ~ 2017.07.28.(금)
- 전 직원 교육
 - 7월 월례조회 : 2017.07.03.(월)

3. 서비스 오픈 일정

- 2017.06.27.(화) : 1차 예산서 투입 및 회계 계정 매핑
- 2017.07.03.(월) ~ 07.07.(금) : 가오픈(Preview) 기간
 - 통합 테스트의 개념으로 정식 서비스 오픈 이전에 전직원을 대상으로 5일간 임시 서비스를 개시하여 시스템 전반적인 기능 테스트
- 2017.07.24.(월) ~ 07.26.(수) : 가오픈 데이터 클리닝 2차 예산서 투입 및 회계계정 매핑
- 2017.08.03.(목) : 타 시스템(우리은행 CMS 및 에스원 지문등록기) 연계 구성을 위한 환경 설정
- 2017.08.04.(금) 19:00 : 현재(AS-IS) ERP 서비스 종료
- 2017.08.07.(월) 08:00 : 신규(TO-BE) ERP 서비스 개시

4. 전체 일정

범 주	구 분	일 정	대 상	내 용
단위 테스트	- 실무자 교육 - 1차 검수	2017.06.12. ~ 2017.07.07.	실무자	예산, 회계, 인사, DDP운영현황, 사업체 계관리, 경영현황관리, 특근매식비, 급여, 네트워크관리, 근태, 고정자산 등 실무 담당자에 의한 개별 단위 기능 테스트
	- 1차	2017.06.26.		ERP 및 전자결재시스템 운영 데이터 1차 이관
통합 테스트	- 1차 예산 회계 계정 매핑	2017.06.27.	개발자	1차 예산계정과 회계계정과목 매핑 설정
	- 가오픈 개시	2017.07.03.	전직원	전직원 통합 테스트 개시
	- 가오픈 종료	2017.07.07.	전직원	전직원 통합 테스트 종료

4. 전체 일정(계속)

범 주	구 분	일 정	대 상	내 용
디버깅 (오류수정)	- 오류수정	2017.07.10. ~ 2017.07.14.	개발자	통합테스트 대응 오류 수정
	- 교육	2017.07.17. ~ 2017.07.20.	서무	예산/회계/인사/사업체계관리/DDP운영현황/특근매식비 등 각 팀별 서무 담당자 1차 교육
	- 통합테스트 2차: 예산 회계계정 매핑	2017.07.24.	개발자	2차 예산계정과 회계계정과목 매핑 설정
	- 시스템 연계	2017.08.03.		우리은행 CMS 및 에스원 지문등록기 연결 구성
서비스 오픈	- (현)ERP 종료	2017.08.04.	전직원	현재 운영중인 ERP서비스 종료
	- 교육(전직원)	2017.08.07.		전직원 대상 집체 교육 실시
	- 서비스 개시			ERP 및 전자결재 고도화 연계구축 서비스 오픈
	- 교육(서무)	2017.08.08. ~ 2017.08.11.	서무	예산/회계/인사/사업체계관리/DDP운영현황/특근매식비 등 각 팀별 서무 담당자 2차 교육
	- 최종 검수	2017.08.14. ~ 2017.08.18.	실무자	예산, 회계, 인사, DDP운영현황, 사업체계관리, 경영현황관리, 특근매식비, 급여, 네트워크관리, 근태, 고정자산 등 실무 담당자에 의한 최종 검수 진행
안정화	- 안정화	2017.08.22 ~ 2017.10.31	전직원	서비스 오픈에 따른 시스템 안정화 3개월 소요 예상

※ 개발 완성도에 따라 일정 변경 가능

- 붙임 : 1. 「ERP(경영관리) 및 전자결재시스템 고도화 연계 구축 사업」
계약 변경 (기간연장) 의뢰 1부.
2. 시스템 오픈 일정 1부.
3. (1차검수) 완료 내역 1부.
4. 테스트 시나리오 1부. 끝.
