

		시 민			
문서번호	자연생태과-609	주무관	생태복원팀장	자연생태과장	푸른도시국장
결재일자	2014.1.10.	손경이	안수연	김재경	01/10 오해영
공개여부	대시민공개				
방침번호		협 조			

함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울

2014년 우수지 습지 생태복원 추진계획

희망서울
함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울

2014. 1

푸른도시국
(자연생태과)

사전 검토항목

∴ 해당사항이 없을 경우 '무 ■' 표시하시기 바랍니다.

검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시 민 참 여 고 려 사 항	● 시 민 : 유 <input type="checkbox"/> () 무 ■
	● 이 해 당 사 자 : 유 <input type="checkbox"/> () 무 ■
	● 전 문 가 : 유 <input type="checkbox"/> () 무 ■
	● 음 브 즈 만 : 유 <input type="checkbox"/> () 무 ■
법 령 및 기 타 고 려 사 항	● 법 령 규 정 : 교통 <input type="checkbox"/> 환경 ■ 재해 <input type="checkbox"/> 기타 <input type="checkbox"/> () 무 <input type="checkbox"/>
	● 기 타 사 항 : 고용효과 <input type="checkbox"/> 노동인지 <input type="checkbox"/> 균형인지 <input type="checkbox"/> 홍보 <input type="checkbox"/> 취약계층 <input type="checkbox"/> 성인지 <input type="checkbox"/> 장애인 <input type="checkbox"/> 디자인 <input type="checkbox"/> 갈등발생 가능성 <input type="checkbox"/> 유지관리 비용 <input type="checkbox"/> 무 ■
타 자 원 의 활 용	● 중 앙 부 처 : 유 <input type="checkbox"/> () 무 ■
	● 민 간 단 체 : 유 <input type="checkbox"/> () 무 ■
	● 기 업 : 유 <input type="checkbox"/> () 무 ■
관 계 기 관 및 단 체 협 의	● 관 계 기 관 : 유 ■ (관련자치구) 무 <input type="checkbox"/>
	● 민 간 단 체 : 유 <input type="checkbox"/> () 무 ■
	● 시 산 하 기 관 : 유 <input type="checkbox"/> () 무 ■

2014년 우수지 습지 생태복원 추진계획


우수지 본래의 저수기능을 유지하면서 토양정화 수행초화류 등을 식재하여 친환경 휴식공간으로 조성

I 사업개요

- 위 치 : 영등포구 양평동3가 57번지 (양평제1우수지)
- 사업규모 : 34,000 m²
- 사업내용 : 토양정화 수생초화류 등 식재
- 사업기간 : 2014. 1 ~ 2014. 10
- 총사업비 : 100백만원
- 연차별 추진계획(※ 세부 추진현황 별첨)

구 분	계	2008~2011	2012	2013	2014
우수지 습지 생태복원사업	총17개소 274,270 m ²	13개소 186,948 m ²	2개소 13,000 m ²	1개소 40,322 m ²	1개소 34,000 m ²
예산액(백만원)	7,959	5,509	1,630	720	100

● 사업대상지 현황

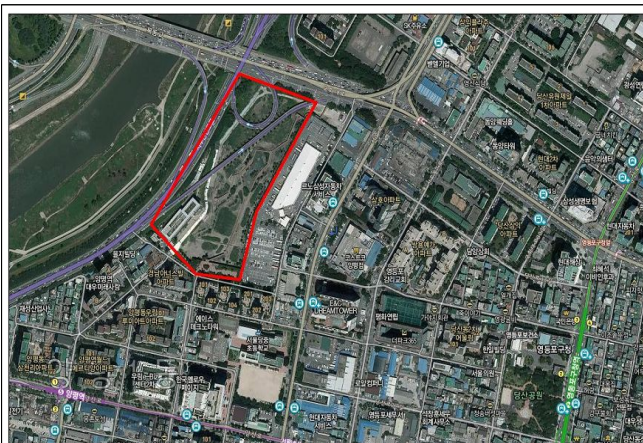

위 치 도



현황사진

II 추진방향

- 우수지 본래의 저수기능에는 지장을 주지 않는 범위 내에서 물억새, 부들, 수련 등의 수생식물과 수목 식재 등 경관 개선
- 수생초화류 식재 및 다양한 부대시설 조성으로 주민 휴식공간 제공

III 추진일정 및 절차

- 사업추진 계획 수립·통보(자연생태과⇨시행기관) : '14. 1. 20.限
- 용역타당성 심사(시행기관⇨기술심사담당관) : '14. 1. 20 ~ 2. 20
- 설계 용역 시행(시행기관) : '14. 2. ~ 5. 30
 - 설계용역 추진시 우리시에 2회(중간 및 최종) 이상 추진사항 보고
 - 공사착공전 시 하천관리과 및 자치구 우수지 관리부서와 협의 등 제반절차 이행
- 설계심의(시행기관⇨자연생태과) : '14. 4. ~ 5.
 - 설계심의는 설계 공정 70% 정도 진행 시 요청
 - ※ 2014년 설계심의는 대상지 현장에서 실시 예정
- 계약심사(시행기관 자체 일상감사) : '14. 4. ~ 5.
- 특정제품 선정위원회 심사(시행기관) : 물품구매 및 공사발주 시
 - 물품제조.구매의 경우
 - 특정제품의 품명당 가격이 2천만원을 초과하는 경우
 - 특정한 설비·기술이 요구되는 추정가격이 2천만원을 초과하는 물품제조의 경우 등

- 공사의 경우
 - 공사금액중 특정제품의 품명당 가격이 5천만원을 초과하는 경우
 - 특정공법의 설계금액이 1억원을 초과하는 전문공사를 포함하는 경우 등

- **공사시행(시행기관)** : '14. 6. ~ 10.
- **공사 착 · 준공보고** : 발주는 6월초 이전, 준공은 10월말 완료
 - 사업완료 후 사업비 집행액 세부내역(지출원인행위부 등), 준공내역서, 공사현장 사진 등을 첨부하여 제출

IV 세부 추진 방법(추진상의 유의사항)

- 설계단계부터 관련 전문가를 참여시키고, 생물종 복원 중심의 습지 생태복원 추진
- 우수지 본래 기능에 지장을 주지 않는 범위 내에서 녹화사업 추진
- 설계과정에 주민, 유관기관, 해당지역 시·구의원의 의견을 수렴하여 민원발생 등으로 인해 사업이 지연되는 사례가 없도록 조치
- 설계용역시 설계변경 등 주요사항은 우리시와 사전 협의
- 시설물의 디자인 및 색채 등은 『공원시설 색채디자인 가이드라인』 준수
 - 시설물의 재료는 자연친화적(목재, 흙, 자연석재) 소재 사용
 - 번쩍거리는 광택 스테인레스나 철재 재료 사용 자제
 - 시설물의 색채 선정시 자연과의 조화성을 고려하고 색상의 통일성 유지
 - 현란한 원색 사용은 금하고 자연경관의 배경색채로 선택

- 기타 우수지 습지 생태복원 사업 추진에 따른 세부사항은 아래의 규정 등을 참조하여 시행
 - 생태하천 복원사업 추진지침(환경부, 2012)
 - 서울특별시 전문시방서(조경편, 2009년)

V 행정사항

- 사업추진 계획 수립·통보 : 2014. 1. 24.限
- 해당 시행기관에 예산 재배정 : 요청시

- 별 첨
1. 시설공사 업무처리 프로세스 1부.
 2. 우수지 습지 생태복원사업 추진현황(2008~) 1부.
 3. 공원시설 색채디자인 가이드라인 1부.
 4. 특정제품 선정절차 개선안 방침서 사본 1부.
 5. 생태하천 복원사업 추진지침(환경부) 1부. 끝.
