

2019년 빛물마을 조성사업

사업제안서 PPT 작성 안내

사업제안서 PPT 양식은 작성에 도움을 주기 위한 것으로 상황에 맞게 양식을 변경하여 작성하셔도 문제 없음

1. 신청 단체

추진 주체

○ ○ ○ 빗물마을 조성사업 (기간: 2019.1월~2019.12월)

주민협의체	신청 단체명	
	단체 소재지	
	대표자 (연락처)	○ ○ ○ (T. 010-0000-0000)
자치구	해당 자치구	
	주관 부서 (연락처)	○ ○ ○과 ○ ○ ○팀 (담당자 T. 02-0000-0000)
	구조직 구성 (T/F팀)	공원녹지과() + 주민자치센터() +

2 주민활동 사진

■ 주민활동 사진

- 도시재생사업 및 타 사업 주민활동 사진 등 또는 자체 빗물마을 사업을 위한 사전 주민워크숍 실적 사진 등 활동사진 및 내용

3. 사업의 목적 (필요성)

■ 사업의 필요성

- 빗물마을 주민 홍보 및 사전 워커숍, 설명회 등 근거 설명
- 빗물관리시설 설치에 필요한 지역특성, 주민 요구, 기타 사업과 연계한 시너지 등

■ 사업의 목적

- 사업을 통해 얻고자 하는 목적 기술

4. 사업개요

마을 개요

- 위치 :
- 면적 : (m²)
- 용도지역
- 건축물 : (동)
- 인수구 :

대상지 현황

- 사업 지역의 일반적 특징 기술
(지역 특성, 사업구역 내 타사업 진행 현황 등)

위치도 (예시)



5. 마을 현장 사진

■ 마을 현장사진

- 마을 특성 등이 드러나도록 자유롭게 구성




- 마을 특성 등이 드러나도록 자유롭게 구성



6. 사업대상지 기술적 검토

하수관망도

- 빗물관리시설 설치 필요성 기술적 검토(모니터링 가능지 검토,

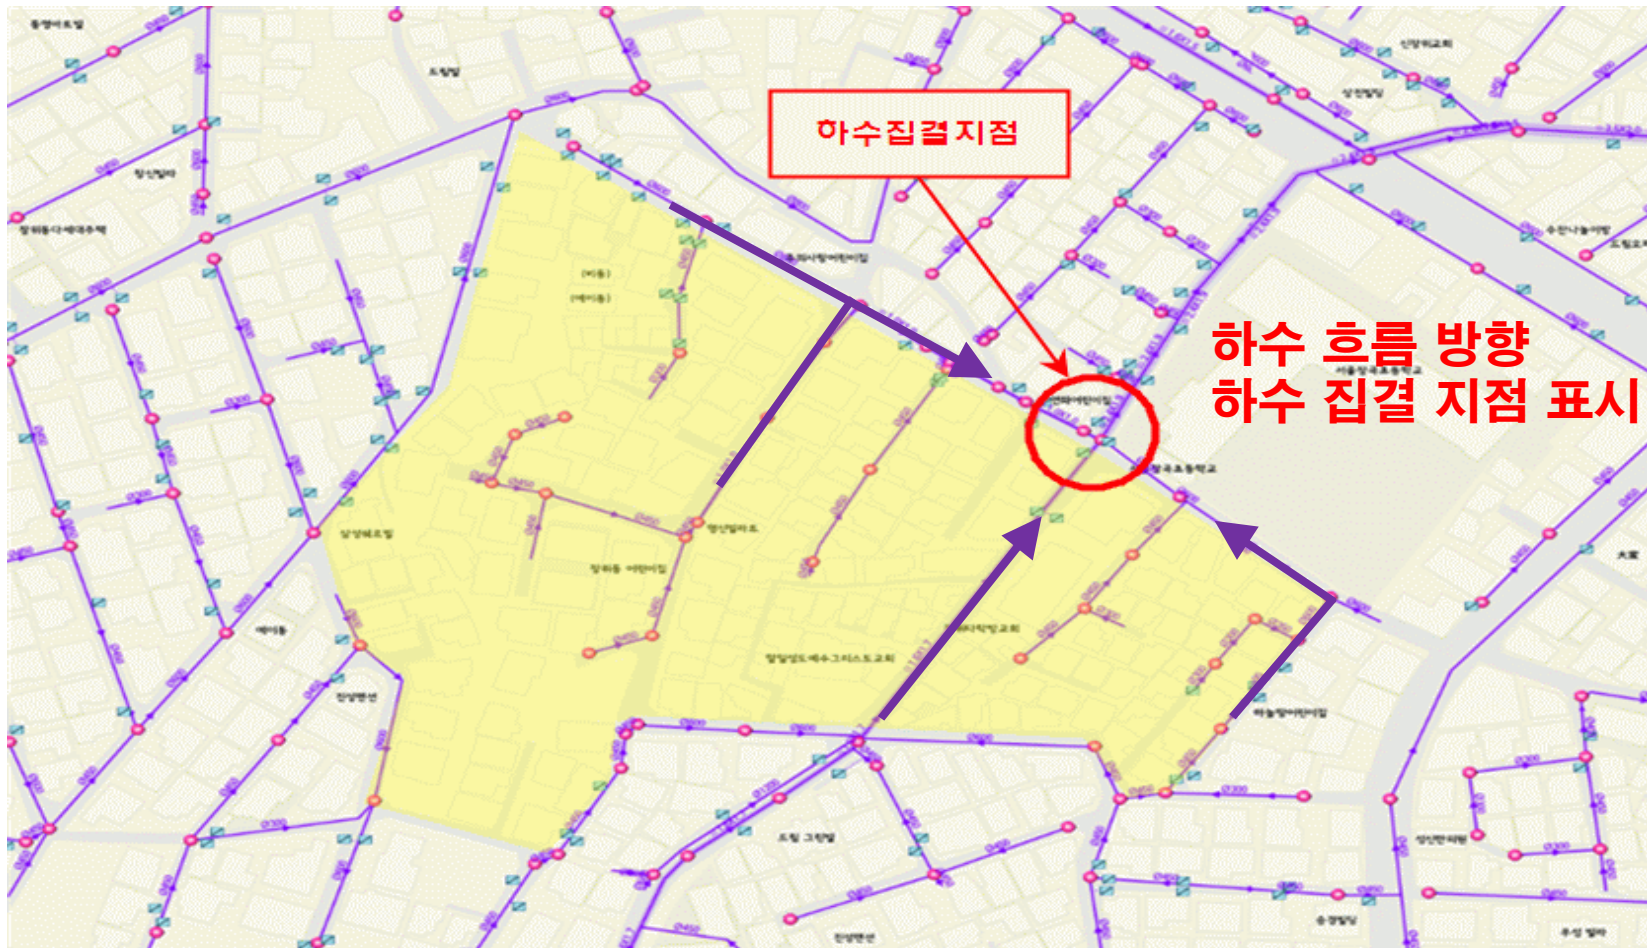

7. 사업 세부내용

■ 종합계획도 (예시1)



7. 사업 세부내용

■ 종합계획도 (예시2)



7. 사업 세부내용

주요 포함 사항



공공시설 활용
그린빗물인프라 제안



다양하고 마을 특성에 맞는
빗물 이용 및 관리시설



체험 및 교육 프로그램
운영이 가능한 시설, 구간

7. 사업 세부내용

세부 설치계획안 - 공공시설 활용 그린빗물인프라 (예시)

공공건물 에 빗물쉼터 및 교육공간으로 조성

송정동 주민자치센터 활용 옥상녹화, 쉼터 및 교육공간 조성

▶ 현황

- 지상3층 건물로 옥상 및 건물 앞에 주민쉼터가 있음



▶ 계획

- 옥상 녹화사업 및 주민쉼터를 빗물쉼터로 만들고 시민에게 교육할 수 있는 공간으로 조성




7. 사업 세부내용

세부 설치계획안 - 다양한 빗물관리,이용시설 제안 (예시)

건물 옥상녹화 및 빗물저금통 설치

위 치	■ 독산1동 1100번지 일대 단독·다가구 지역
사업내용	■ 옥상녹화 600m ² , 빗물저금통 10개소 ■ 빗물을 이용한 식물 재배로 자원 절약 실천

[Key Map]

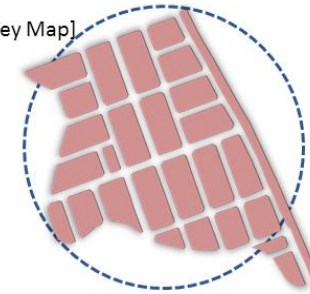

금하마을 옥상 (현)



옥상 텃밭 및 빗물저금통 (예시)

8. 총 사업비

■ 사업 예산 (천원)

① 총 사업비 :

* ① = ② + ③

② 지원비:

* 750,000 이하

③ 지원비 외:

* 추가로 자체예산 확보 및 투자계획

9. 주민참여 및 부서간 협업

■ 주민 참여 방안

- 자발적 주민 참여를 위한 방안
- 주민의견 수렴 방안 등

■ 부서간 협업체계

- 부서간 협업체계 구축계획, 역할 기술 등

10. 유지관리

■ 사후 유지관리

- 사업 이후 유지관리를 위한 관리방안 구체적 기술
- 유지관리 주체 및 방안

11. 기대효과

■ 마을 기대효과

- 빗물마을 조성사업을 통한 환경개선, 삶의 질 향상 등 마을의 기대효과 기술

감사합니다.

담당부서 서울시청 물순환정책과
문의전화 02-2133-3853
